



СРО-П-174-01102012

Заказчик – ООО «Байкальская энергетическая компания», филиал ТЭЦ-9

ОТВАЛ СУХОГО СКЛАДИРОВАНИЯ ЗОЛОШЛАКОВ

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 6. Проект организации строительства

972-ПОС

Том 7

СРО-П-174-01102012

Заказчик – ООО «Байкальская энергетическая компания», филиал ТЭЦ-9

ОТВАЛ СУХОГО СКЛАДИРОВАНИЯ ЗОЛОШЛАКОВ

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 6. Проект организации строительства

972-ПОС

Том 7

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			

Генеральный директор
ООО «Институт Красноярскгидропроект»

Главный инженер проекта



В.А. Вайкум

А.Е. Лебеденко

8	Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения сооружения.....	26
9	Технологическая последовательность работ	28
9.1	Подготовка территории	28
9.1.1	Ликвидация ГТС, расчистка территории и вырубка зеленых насаждений.....	28
9.1.2	Планировка гребней дамб до отметок планировки поверхности золошлакоотвала	28
9.1.3	Укрытие поверхности золошлакоотвала латексной эмульсией.....	28
9.2	Строительство отвала сухого складирования золошлаков	29
9.2.1	Устройство пруда-отстойника с экранированием.....	29
9.2.2	Устройство водосборных канав и инспекционного проезда	29
9.2.3	Устройство противофильтрационного экрана основания отвала.....	31
9.2.4	Складирование золошлаков в насыпной отвал.....	31
9.3	Рекультивация.....	32
10	Способы производства основных строительного-монтажных работ.....	33
10.1	Подготовительные работы	33
10.2	Земляные работы	35
10.3	Монтажные и сварочные работы	38
10.4	Крепление водосборных канав бетонным полотном	39
10.5	Устройство противофильтрационного экрана.....	40
10.6	Выполнение строительного-монтажных работ при низких температурах.....	44
11	Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций	46
12	Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в электроэнергии, воде и других ресурсах, временных зданиях и сооружениях	47
12.1	Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах	47
12.2	Потребность строительства в кадрах	50
12.3	Потребность во временных зданиях и сооружениях	52
12.4	Потребность в электроэнергии, воде и других ресурсах	54
13	Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов и конструкций	58
14	Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля и по обеспечению контроля качества	

Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	972-ПОС						Лист
															2

строительно-монтажных работ, а также поставляемых конструкций и материалов	60
14.1 Входной контроль	60
14.2 Операционный контроль	60
14.3 Приемочный контроль	63
14.4 Лабораторный контроль	63
14.5 Геодезический контроль	64
14.6 Исполнительная документация.....	65
15 Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций.....	66
16 Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве	67
17 Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период строительства	68
18 Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда.....	71
19 Описание проектных решений и мероприятий по охране объекта в период строительства	79
20 Описание проектных решений и мероприятий по реализации требований, предусмотренных пунктом 8 требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе проектирования и строительства	80
21 Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта	81
22 Обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального строительства.....	82
22.1 Подготовительный период	82
22.2 Основной период	83
22.3 Рекультивация	85
22.4 Общая продолжительность выполнения работ	86
Список литературы	87
Приложение А Транспортные схемы по объекту: «Отвал сухого складирования золошлаков»	89
Приложение Б Подбор грузоподъемного крана для производства строительно-монтажных работ. Расчет опасных зоны, связанных с применением грузоподъемного крана	90

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Проектная документация разработана на строительство отвала сухого складирования золошлаков на территории существующего намывного золошлакоотвала участка №1 ТЭЦ-9.

Существующий золошлакоотвал (ЗШО) участка №1 находится на левобережье р. Ангары (протока Голуторовская), частично в 200 метровой водоохранной зоне р. Ангары.

ЗШО – пойменный, трехсекционный, представляет собой неправильный многоугольник, ограниченный со всех сторон ограджающей дамбой (см. Рисунок 1.1).

Общая площадь земельных участков, занимаемая ЗШО, составляет 117,6 га.

Подробное описание золошлакоотвала приведено в разделе 12 ПД «Декларация безопасности гидротехнических сооружений» (см. том 972-ДБГ).



Рисунок 1.1 – ЗШО участка №1 ТЭЦ-9

На данный момент эксплуатация ГТС ЗШО участка №1 ТЭЦ-9 остановлена, намыв золошлаков в секции не производится. Все три секции золошлакоотвала находятся в резерве.

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

972-ПОС

Лист

5

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль		В
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь	м/с	2,9
Средняя скорость ветра за период со среднесуточной температурой воздуха $\leq 8^{\circ}\text{C}$	м/с	2,1
Климатические параметры тёплого периода		
Барометрическое давление	гПа	963
Средняя максимальная температура наиболее тёплого месяца	$^{\circ}\text{C}$	25,0
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее тёплого месяца	$^{\circ}\text{C}$	12,5
Средняя месячная относительная влажность наиболее тёплого месяца	%	73
Средняя месячная относительная влажность наиболее тёплого месяца в 15 часов	%	57
Преобладающее направление ветра за июнь - август		3
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль	м/с	1,7

2.3 Опасные гидрометеорологические процессы и явления

Согласно СП 11-103-97 (Приложение Б) к опасным гидрометеорологическим процессам и явлениям относятся: наводнения, цунами, ураганные ветры, снежные лавины, гололёд, селевые потоки, русловой процесс, наледные явления. Ниже охарактеризована возможность возникновения каждого из явлений (процессов) в пределах рассматриваемой территории (Таблица 2.2).

Таблица 2.2 – Характеристика опасных гидрометеорологических процессов и явлений на территории изысканий согласно приложению, Б СП 11-103-97

Процессы, явления	Количественные показатели проявления процессов и явлений	Проявление в пределах участка изысканий
Наводнения (затопление)	Затопление на глубину более 1,0 м при скорости течения воды более 0,7 м/с	не проявляется
Ветер	Скорость более 30 м/с, для побережий морей более 35 м/с, при порывах более 40 м/с	не проявляется максимальный наблюдаемый порыв ветра 28 м/с
Дождь	Слой осадков более 30 мм за 12 часов и менее в селевых и ливнеопасных районах Более 50 мм за 12 часов и менее на остальной территории 100 мм за 2 суток и менее, 150 мм за 4 суток и менее, 250 мм за 9 суток и менее, 400 мм за 14 суток и менее	проявляется наблюдённый суточный максимум осадков составляет 114 мм
Ливень	Слой осадков более 30 мм за 1 ч и менее	проявляется
Гололёд	Отложение льда на проводах толщиной стенки более 25 мм	не проявляется
Селевые потоки	Динамическое воздействие селевого потока на все виды сооружений, размыв русла в зоне его транспорта и отложение материала в пределах конуса выноса	неселеопасный район

Изн. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

Изм.	Коп. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

972-ПОС

Лист

10

4 ОЦЕНКА РАЗВИТОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Объект строительства расположен в г. Ангарске Иркутской области, на территории золошлакоотвала участка №1 ТЭЦ-9.

Ангарск с прилегающими населенными пунктами образует Ангарский городской округ. Ближайшие города – г. Усолье-Сибирское, расположенный на расстоянии около 30 км по прямой на северо-запад, и г. Иркутск, расположенный на расстоянии около 40 км по прямой на юго-восток.

Город Иркутск является административным центром и самым крупным населенным пунктом Иркутской области. Расстояние до площадки строительства составляет по автодороге около 56 км.

Транспортная инфраструктура района представлена автомобильным и железнодорожным видами транспорта.

Через г. Ангарск проходят федеральная автомобильная дорога Р-255 «Сибирь» (Новосибирск – Иркутск) и Транссибирская железнодорожная магистраль.

Ситуационная схема района строительства приведена на рисунке 4.1.

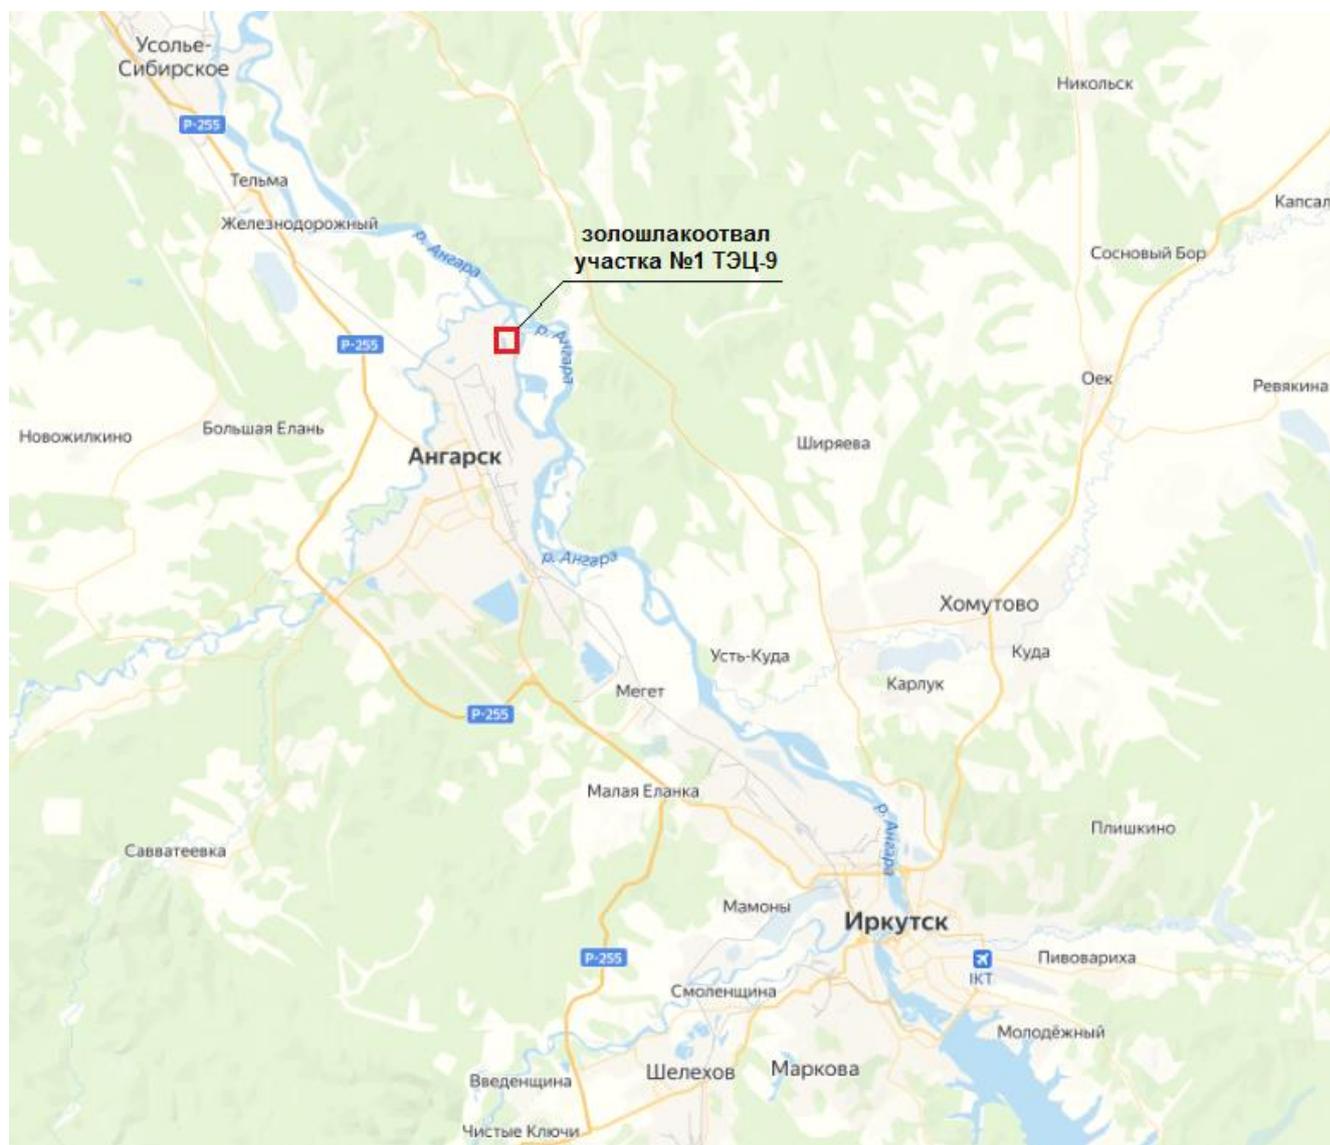


Рисунок 4.1 – Ситуационная схема района строительства

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

5 СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, А ТАКЖЕ СТУДЕНЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ

Работы осуществляются с привлечением подрядной организации, выбор которой определяется Заказчиком на конкурсной или иной основе.

Подрядную организацию следует выбирать исходя из наличия у строительной организации специализированной техники и специалистов, имеющих опыт в производстве строительных работ данного рода.

Привлечение для осуществления работ необходимых специалистов входит в обязанности Подрядчика. До производства работ допускаются только инженерно-технические работники и рабочие строительных специальностей, квалификация которых подтверждается соответствующими документами.

Для производства работ требуется привлечение квалифицированных инженеров-строителей, машинистов строительной техники, крановщиков, водителей КАМАЗов, а также разнорабочих.

Строительная площадка расположена в г. Ангарске, в непосредственной близости от крупного города Иркутска, а также г. Усолье-Сибирское.

В связи с наличием специалистов необходимой квалификации в данных населенных пунктах для производства работ используется местная рабочая сила (как квалифицированные специалисты, так и подсобные рабочие). Привлечение квалифицированных специалистов из других отдаленных городов не требуется.

Привлечение студенческих строительных отрядов для осуществления работ не представляется возможным, так как технология производства работ не предусматривает работ, на которые возможно привлечение студотрядов.

Производство работ вахтовым методом не требуется. При производстве работ задействуются специалисты, проживающие в г. Ангарске, а при необходимости, из близлежащих городов. Дополнительного выделения жилья для них не предусматривается.

Доставку рабочих до строительной площадки осуществляет подрядная организация специальным автотранспортом.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

6 ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА

Земельный участок, предоставляемый для строительства, находится по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, 5-й квартал, уч. №1, ТЭЦ-9 ООО «Байкальская энергетическая компания».

Строительство отвала сухого складирования золошлаков осуществляется на территории золошлакоотвала участка №1 ТЭЦ-9.

Золошлакоотвал равнинного типа, трехсекционный (секции № 2, №3, №4), ограничен ограждающей дамбой протяженностью 6725 м.

Существующий золошлакоотвал находится на левобережье р. Ангары (протока Голуторовская) и частично (территории секций №2 и №3) попадает в 200 метровую водоохранную зону р. Ангары.

Секции №2 и №3 золошлакоотвала расположены на земельном участке с кадастровым номером 38:26:041201:509, площадь земельного участка – 917 504 м².

Секция №4 золошлакоотвала расположена на земельном участке с кадастровым номером 38:26:041201:9, площадь земельного участка – 258 160 м².

Схема границ ЗУ 38:26:041201:509 представлена на рисунке 6.1, ЗУ 38:26:041201:9 – на рисунке 6.2.

Категория земель: «Земли населенных пунктов».

Земельные участки переданы ООО «БЭК» на условиях долгосрочной аренды. Арендодатель – ПАО «Иркутскэнерго».



Рисунок 6.1 – Схема границ ЗУ 38:26:041201:509

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

972-ПОС

Лист

21



Рисунок 6.2 – Схема границ ЗУ 38:26:041201:9

Размещение строительных механизмов, бытового городка и устройство площадок складирования, а также все строительные работы, производятся в пределах выделенных земельных участков предприятия.

Необходимость использования земельных участков вне земельных участков, предоставляемых для строительства, не возникает.

Подробная характеристика земельных участков приведена в разделе 1 ПД «Пояснительная записка» (см. том 972-ПЗ).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №					972-ПОС	Лист
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.		Подп.

7 ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ, В МЕСТАХ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И СВЯЗИ

Работы ведутся в условиях действующего предприятия ООО «Байкальская энергетическая компания» на территории золошлакоотвала участка №1 ТЭЦ-9.

В настоящий момент намыв золошлаков в секции не производится, эксплуатация гидротехнических сооружений остановлена, ГТС подлежат ликвидации.

На территории золошлакоотвала участка №1 ТЭЦ-9 запроектировано строительство отвала сухого складирования золошлаков, образующихся при работе ТЭЦ-9, ТЭЦ-10 и Ново-Иркутской ТЭЦ (Шелеховский участок).

На территории золошлакоотвала располагаются недействующие ВЛ, подлежащие демонтажу в рамках подготовки территории к строительству отвала сухого складирования золошлаков.

Существующие подземные коммуникации, а также действующие линии электропередачи и связи в зоне производства работ отсутствуют.

Стесненные условия производства работ не возникают.

Изм.	Коп.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	972-ПОС	Лист
										23

Подготовка территории включает в себя:

- 1 Ликвидация ГТС, расчистка территории (демонтаж) и вырубка зеленых насаждений.
- 2 Планировка гребней дамб до отметок планировки поверхности золошлакоотвала.
- 3 Укрытие поверхности золошлакоотвала латексной эмульсией.

Для сокращения сроков производства подготовительных работ, работы по подготовке территории следует производить независимыми параллельными потоками.

К работам основного периода разрешается приступать только после окончания всех работ подготовительного периода.

Основной период

Строительство отвала сухого складирования золошлаков производится в следующей последовательности:

- 1 Устройство пруда-отстойника с экранированием.
- 2 Устройство водосборных канав и инспекционного проезда.
- 3 Устройство противофильтрационного экрана основания отвала.
- 4 Складирование золошлаков в насыпной отвал.

Для организации сбора и отвода поверхностного стока с территории ЗШО в первую очередь производится устройство пруда-отстойника и водосборных канав.

Устройство противофильтрационного экрана основания производится в процессе отсыпки 1 яруса отвала (по мере готовности захваток).

Складирования золошлаков в насыпной отвал возможно начинать сразу после окончания работ по устройству пруда-отстойника и водосборных канав, при условии того, что будет экранировано основание отвала на рабочей захватке.

Рекультивация

Рекультивация включает в себя:

- 1 Рекультивация территории ЗШО, попадающей в ВОЗ.
- 2 Рекультивация поверхности насыпного отвала.
- 3 Рекультивация прилегающей к отвалу территории.

Рекультивация участка в водоохранной зоне р. Ангара производится в первую очередь, на этапе подготовки территории к складированию золошлаков. Рекультивация поверхности отвала производится в процессе его отсыпки (по мере готовности захваток), рекультивация прилегающей к отвалу территории – после полной рекультивации отвала.

Технологическая последовательность работ, а также способы производства основных строительно-монтажных работ приведены в разделах 9-10.

Календарный график производства работ приведен на листе 1 графической части.

Все территории, используемые в процессе работ, должны по окончании работ приводиться в состояние пригодное для дальнейшего хозяйственного использования, а также производится разборка всех временных зданий и сооружений. Все бытовые и строительные отходы подлежат вывозу с территории стройплощадки на полигон отходов.

Работы должны производиться с соблюдением нормативных документов, регламентов, инструкций и ПД, с оформлением нарядов-допусков, актов и других документов, с назначением ответственных лиц за подготовку, организацию, проведение работ и обеспечение мер безопасности, с соблюдением ППР, согласованного и утвержденного Заказчиком.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

							972-ПОС	Лист
								25
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата			

отстойника. Устройство инспекционного проезда на участке примыкания водосборных канав к пруду-отстойнику осуществляется после обратной засыпки водоперепускной трубы.

Технологическая последовательность работ:

1 Устройство инспекционного проезда:

- отсыпка инспекционного проезда из щебня фр. 40-120 мм ГОСТ 8267-93, толщиной $t=0,5$ м ($\rho=1,6$ т/м³), автосамосвалами г/п 20 т с планировкой бульдозером мощностью 118 кВт и уплотнением грунтовым катком массой 14 т ($k_{уп}=0,92-0,95$), за 6-8 проходов по одному следу.

2 Устройство участка примыкания водосборных канав к пруду-отстойнику:

- выемка грунта под строительство участка примыкания к пруду-отстойнику ($\rho=1,08$ т/м³), экскаватором с ковшом 0,25 м³, частично с погрузкой на автосамосвалы г/п 20 т и перевозкой на расстояние до 1 км в отвал, частично складирование вдоль траншеи для использования в обратной отсыпке;
- выемка грунта под траншею водоперепускной трубы ($\rho=1,08$ т/м³), экскаватором с ковшом 1 м³, с погрузкой на автосамосвалы г/п 20 т и перевозкой на расстояние до 1 км в отвал;
- отсыпка подготовки под трубу из щебня фр. 20-40 мм ГОСТ 8267-93, толщиной $t=0,45$ м ($\rho=1,6$ т/м³), экскаватором с ковшом 1 м³, с уплотнением виброплитой ($k_{уп}=0,92-0,95$);
- установка звеньев трубы автомобильным краном г/п 16 т;
- устройство межсекционных швов путем забивки бетонного полотна;
- гидроизоляция звеньев трубы битумом БН50/50 ГОСТ 6617-76, за 2 раза по грунтовке из раствора битума в бензине;
- засыпка трубы щебнем фр. 20-40 мм ГОСТ 8267-93 ($\rho=1,6$ т/м³), экскаватором с ковшом 1 м³, с послойным уплотнением толщиной слоя 0,5 м виброплитой ($k_{уп}=0,92-0,95$);
- засыпка пазух грунтами выемки ($\rho=1,08$ т/м³), экскаватором с ковшом 1 м³, с послойным уплотнением толщиной слоя 0,5 м виброплитой ($k_{уп}=0,92-0,95$);
- укладка бетонного полотна Т-8 на участке примыкания к пруду-отстойнику.

3 Устройство водосборных канав:

- выемка грунта под строительство водосборных канав №1 и №2 ($\rho=1,08$ т/м³), экскаватором с ковшом 0,25 м³, с погрузкой на автосамосвалы г/п 20 т и перевозкой на расстояние до 1 км в отвал;
- укладка бетонного полотна Т-8 на участках водосборных канав №1 и №2;
- выемка грунта под укладку водоперепускной трубы ($\rho=1,08$ т/м³), экскаватором с ковшом 1 м³, частично с погрузкой на автосамосвалы г/п 20 т и перевозкой на расстояние до 1 км в отвал, частично складирование вдоль траншеи для использования в обратной отсыпке;
- отсыпка подготовки под трубу из щебня фр. 20-40 мм ГОСТ 8267-93, толщиной $t=0,45$ м ($\rho=1,6$ т/м³), экскаватором с ковшом 1 м³, с уплотнением виброплитой ($k_{уп}=0,92-0,95$);
- монтаж стальной трубы $\varnothing 1020$ мм ГОСТ10704-91, толщиной стенки $t=8$ мм, автомобильным краном г/п 16 т;
- обратная засыпка траншеи грунтами выемки ($\rho=1,08$ т/м³), экскаватором с ковшом 1 м³, с послойным уплотнением толщиной слоя 0,5 м виброплитой ($k_{уп}=0,92-0,95$).

Изм.	Коп. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инва. № подл.	972-ПОС	Лист
										28

- укрытие поверхности захваток (1-4 яруса) латексной эмульсией (Латекс ВДСМ-КИ-01-03 и вода);
- укрытие поверхности захваток (5 яруса) растительным грунтом в рамках технического этапа рекультивации, толщиной $t=0,3$ м ($\rho=1,4$ т/м³), с отсыпкой грунта автосамосвалами г/п 20 т и планировкой бульдозером мощностью 118 кВт.

Более подробно технология отсыпки золошлаков рассмотрена в составе раздела 5 подраздела 7 ПД «Технологические решения» (см. том 972-ИОС7).

9.3 Рекультивация

Рекультивации подлежит территория золошлакоотвала участка №1, попадающая в водоохранную зону р. Ангара, поверхность насыпного отвала и остаточная территория золошлакоотвала участка №1.

Рекультивацию участка в водоохранной зоне необходимо произвести на этапе подготовки территории к складированию золошлаков, рекультивацию внешних откосов и поверхность 5 яруса отвала – сразу после их отсыпки (по мере готовности захваток), рекультивацию прилегающей к отвалу территории – после полной рекультивации отвала.

Рекультивацию предусматривается выполнить в два этапа: технический и биологический.

Технологическая последовательность работ:

- укрытие поверхности водоохранной зоны растительным грунтом в рамках технического этапа рекультивации, толщиной $t=0,3$ м ($\rho=1,4$ т/м³), с отсыпкой грунта автосамосвалами г/п 20 т и планировкой бульдозером мощностью 118 кВт;
- гидропосев семян трав на поверхность водоохранной зоны в рамках биологического этапа рекультивации;
- укрытие поверхности откосов 1-4 яруса и поверхности 5 яруса отвала растительным грунтом в рамках технического этапа рекультивации, толщиной $t=0,3$ м ($\rho=1,4$ т/м³), с отсыпкой грунта автосамосвалами г/п 20 т и планировкой бульдозером мощностью 118 кВт;
- гидропосев семян трав на поверхность откосов 1-4 яруса и поверхности 5 яруса отвала в рамках биологического этапа рекультивации;
- засыпка водосборных канав грунтами подсыпки инспекционного проезда бульдозером мощностью 118 кВт с перемещением грунта до 10 м;
- засыпка пруда-отстойника золошлаками ($\rho=1,36$ т/м³), слоями не более 0,6 м, автосамосвалами г/п 25 т с разравниванием и планировкой бульдозером мощностью 118 кВт и послойным уплотнением грунтовым катком массой 14 т ($k_{уп}=0,95$), за 5-6 проходов по одному следу;
- укрытие поверхности прилегающей к отвалу территории растительным грунтом в рамках технического этапа рекультивации, толщиной $t=0,3$ м ($\rho=1,4$ т/м³), с отсыпкой грунта автосамосвалами г/п 20 т и планировкой бульдозером мощностью 118 кВт;
- гидропосев семян трав на поверхность прилегающей к отвалу территории в рамках биологического этапа рекультивации.

Более подробно решения по рекультивации рассмотрены в составе раздела 12 ПД «Проект рекультивации» (см. том 972-ПР).

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

10 СПОСОБЫ ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

При производстве строительно-монтажных работ руководствоваться основными положениями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1» [8] и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2» [9].

При производстве земляных работ руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» [23].

При производстве монтажных, бетонных и железобетонных работ руководствоваться требованиями СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» [24], также при производстве бетонных и железобетонных работ руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» [23] и СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции» [25].

10.1 Подготовительные работы

В подготовительный период в рамках подготовки территории к строительству отвала сухого складирования золошлаков необходимо произвести ликвидацию ГТС, расчистку территории (демонтаж) и вырубку зеленых насаждений.

Основные технические и организационно-технологические решения по ликвидации гидротехнических сооружений и демонтажу сооружений, расположенных на территории золошлакоотвала, разработаны в составе раздела 7 ПД «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства» (см. том 972-ПОД).

Расчистка территории и вырубка зеленых насаждений

Расчистка территории и вырубка зеленых насаждений заключается в сводке кустарниковой растительности и сносе сети наружного электроснабжения, столбов и кабелей в пределах территории золошлакоотвала.

Сводку кустарника производить навесным корчевателем на бульдозер ДЗ-27С. Выкорчеванную растительность грузят в автосамосвалы КАМАЗ г/п 20 т вручную или при помощи мини-погрузчика Bobcat и вывозят со строительной площадки на полигон отходов.

ВЛ, подлежащие демонтажу, недействующие. Перед началом работ по демонтажу необходимо удостовериться в отсутствии напряжения.

Провода снимаются с опор при помощи автогидроподъемника (например, АГП-18), опускаются на землю и сматываются на барабаны.

Разработка грунта вокруг опор производится экскаватором Hitachi ZX130-5G с ёмкостью ковша 0,5 м³, демонтаж опор – при помощи автомобильного крана г/п 16 т, задействованном на основном периоде строительства. Строповка опор и при необходимости демонтаж межсекционных болтовых соединений опор производится из корзины автогидроподъемника.

При демонтаже опор с применением автокрана строп закрепляется стропальщиком выше центра тяжести опоры. Опора стропуется, приподнимается на высоту не более 500 мм, проверяется надежность строповки. Поворотом стрелы крана опора отводится в нужном направлении, опускается на землю и разбирается на транспортабельные элементы.

Автокран должен быть установлен таким образом, чтобы угол между осью вращения и стрелой был наименьшим, выставляются и закрепляются аутригеры, люди выводятся из зоны работы автокрана.

После окончания демонтажа опор производится возврат вынутого грунта и его планировка бульдозером ДЗ-27С с уплотнением виброплитой.

Взам. инв. №							972-ПОС	Лист
Подп. и дата							972-ПОС	Лист
Инд. № подл.							972-ПОС	Лист
Изм.	Коп. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

Демонтированные конструкции грузят в автосамосвалы КАМАЗ г/п 20 т вручную или при помощи автомобильного крана. Деревянные и железобетонные элементы вывозят со строительной площадки на полигон отходов. Провода перевозятся на площадку временного складирования металлолома, расположенную на территории участка №1 ТЭЦ-9, и передаются Заказчику с оформлением акта приемки.

Ликвидация ГТС

Ликвидация ГТС включает в себя демонтаж водоприемных шахтных колодцев со служебными мостиками и опорами, а также демонтаж пьезометров и марок.

Разработка грунта вокруг демонтируемых сооружений производится вручную либо экскаватором Hitachi ZX130-5G с ёмкостью ковша 0,5 м³, с последующей обратной засыпкой грунтов выемок бульдозером ДЗ-27С с уплотнением виброплитой.

Резку металлоконструкций и труб демонтируемых сооружений производить при помощи аппарата плазменной резки (например, Мультиплаз-7500), болгарок и гидравлических ручных ножниц. Демонтированные конструкции разрезаются на транспортабельные элементы.

Демонтаж ж/б шандор осуществляется путем последовательной разборки. Шандоры поочередно снимаются автомобильным краном г/п 16 т, задействованном на основном периоде строительства, с погрузкой в автомобили-самосвалы.

Демонтаж части ж/б конструкций шахтных водосбросов производится методом разрушения с помощью экскаватора с навесным оборудованием – гидромолот или отбойных пневматических молотков (например, МОП-4). Далее производится дробление демонтированных конструкций до состояния строительного боя, пригодного для погрузки мини-погрузчиком Bobcat в автомобили-самосвалы.

Обеспечение пневматического инструмента сжатым воздухом производится при помощи передвижного дизельного компрессора (например, ЗИФ-ПВ-4/1,3).

Демонтированные конструкции грузят в автосамосвалы КАМАЗ г/п 20 т вручную, при помощи автомобильного крана или погрузчика. Деревянные и железобетонные элементы вывозят со строительной площадки на полигон отходов. Металлоконструкции и трубы перевозятся на площадку временного складирования металлолома, расположенную на территории участка №1 ТЭЦ-9, и передаются Заказчику с оформлением акта приемки.

После окончания демонтажных работ необходимо заполнить шахты водосбросных колодцев частично бетоном для создания бетонной пробки, частично - песчано-гравийной смесью. Перед укладкой бетона труба водосбросного коллектора заваривается стальным листом при помощи сварочного аппарата (например, Ресанта САИ 190).

Бетонная смесь доставляется к месту производства работ автобетоносмесителем (например, 58146Т) и подается к месту укладки стационарным дизельным бетононасосом (например, СБ-207А).

Уплотнение бетонной смеси производить штыкованием стальным стержнем диаметром 16 мм с закругленным концом. Стержень погружается в бетон частыми толчковыми движениями с небольшой амплитудой. Дойдя до дна смеси стержень начинают раскачивать из стороны в сторону. Затем стержень медленно вынимается с совершением вертикальных и горизонтальных колебательных движений.

Число нажимов стержня рассчитывают из условия, чтобы один нажим приходился на 10 см² верхней открытой поверхности. Штыкование проводят равномерно по спирали от краев к середине.

Грунт засыпки отсыпается мини-погрузчиком и уплотняется виброплитой.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

							972-ПОС	Лист
								32
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата			

10.2 Земляные работы

Разработку грунта осуществлять гусеничными экскаваторами Hitachi ZX65USB 5A с ёмкостью ковша 0,25 м³ и Hitachi ZX-240-3 с ёмкостью ковша 1,0 м³, перевозку и отсыпку грунта – автомобилями-самосвалами КАМАЗ-6520 г/п 20 т, разравнивание и планировку грунта – гусеничным бульдозером ДЗ-27С.

Укладку грунта из автосамосвалов следует производить отдельными кучами. Грунт разгружают по всей площади карты кучами в шахматном порядке и разравнивают полосами при продольных проходках бульдозера.

Отсыпку грунта производить «с колёс», без промежуточного складирования на строительной площадке. При невозможности организации работ по отсыпке непрерывным потоком, необходимо организовать промежуточное складирование на строительной площадке.

Отсыпку и планировку грунта в стесненных условия также возможно производить при помощи колесного мини-погрузчика Bobcat S650.

Планировка откосов производится экскаватором с применением дополнительного навесного оборудования в виде планировочного ковша, в труднодоступных местах при необходимости доработать вручную.

Уплотнение грунта производить грунтовым катком ДМ 62, в стесненных условиях – виброплитой (например, ВУ-11-75) либо виброплитой экскаватора (при наличии), в труднодоступных местах – вручную.

Коэффициент уплотнения – 0,92-0,95. Отступление от заданных величин плотности допустимо только по согласованию с проектной организацией.

Уплотнение грунтов должно производиться при влажности близкой к оптимальной. Допустимые отклонения от оптимальной влажности должны быть установлены техническими условиями и обычно принимаются в пределах ±15-20% ее значения.

При разработке грунта и производстве работ в котлованах необходимо предусматривать меры по предотвращению обрушения грунта.

Рытье котлованов и траншей глубиной более 1,5 м и производство работ в них должно осуществляться по наряду-допуску на выполнение работ повышенной опасности. Перед допуском рабочих в котлован (траншею) должна быть проверена устойчивость откосов.

Производство работ в котлованах и траншеях с откосами, подвергшимися увлажнению, разрешается только после тщательного осмотра мастером состояния грунта откосов и обрушения неустойчивого грунта в местах, где обнаружены «козырьки» или трещины.

Котлованы и траншеи, разработанные в зимнее время, при наступлении оттепели должны быть осмотрены, а по результатам осмотра должны быть приняты меры к обеспечению устойчивости откосов.

Запрещается разработка грунта методом подкопа. При случайном образовании козырьков (навесов) грунта или при нахождении на откосах выемки валунов, камней и т.д. уйти из опасной зоны, после чего козырьки, валуны и камни обрушить сверху.

Для спуска в котлованы и широкие траншеи устанавливать стремянки шириной не менее 0,75 м с перилами, а для спуска в узкие места траншеи - приставные лестницы.

Подготовка основания

В подготовительный период в рамках подготовки территории к строительству отвала сухого складирования золошлаков необходимо произвести планировку гребней дамб до отметок планировки поверхности золошлакоотвала, а также укрытие поверхности золошлакоотвала латексной эмульсией.

Планировка гребней дамб производится путем срезки или отсыпки грунта до отметок планировки поверхности золошлакоотвала.

Изн. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

									Лист
							972-ПОС	33	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата				

Срезка гребня дамб до проектных отметок планировки производится гусеничными бульдозерами ДЗ-27С, с перемещением грунта до 100 м в вылы. Из валов грунт срезки грузится в автосамосвалы г/п 20 т при помощи гусеничного экскаватора ЭО-5124 с ёмкостью ковша 1,5 м³, перевозится на участки подсыпки гребня дамб и отсыпается до отметок планировки. Излишки грунта перевозятся в бурт для последующего использования при строительстве отвала.

Отсыпку грунта на гребень дамб производить слоями до 0,5 м с уплотнением до $K_{упл.} = 0,92-0,95$. Для уплотнения слоев требуется 6-8 проходов катка по одному следу (уточнить в результате опытного уплотнения).

Отсыпка грунта на гребень существующих дамб производится на подготовленное основание, принятое по акту скрытых работ. Основание необходимо очистить от мусора, крупных камней, растительности, а в зимний период от льда и снега.

Для обеспечения непрерывного процесса укладки отсыпку грунта вести параллельными потоками, так, например, на одной карте производится отсыпка грунта автосамосвалами, разравнивание и планировка бульдозером; на второй – уплотнение катком; на третьей – геозамер и контроль качества и т.д.

Для защиты от пыления поверхность золошлакоотвала укрывается слоем латексной эмульсии из латекса ВДСМ-КИ-01-03 по ТУ 2241-004-94229329-2015 и воды. Нанесение латекса производить при помощи поливочных машин ПМ-130.

Устройство пруда-отстойника

Разработка котлована пруда-отстойника производится гусеничным экскаватором Hitachi ZX-240-3 с ёмкостью ковша 1,0 м³. Разработанный грунт (золошлаки) грузится в автосамосвалы г/п 20 т, перевозятся на расстояние до 1 км и отсыпается в отвал.

Для сокращения сроков производства работ устройство пруда-отстойника рекомендуется производить 2-мя экскаваторами.

Дно и откосы пруда-отстойника подлежат экранированию. Технология устройства противофильтрационного экрана рассмотрена в подразделе 10.5.

Для обслуживания пруда-отстойника в период эксплуатации предусмотрен съезд из песчано-гравийной смеси.

Устройство съезда производится путем отсыпки грунта автосамосвалами «пионерно» слоями не более 0,5 м с разравниванием и планировкой бульдозером. Уплотнение грунта производится грунтовым катком до $K_{упл.} = 0,92-0,95$. Ориентировочное число проходов уплотняющих машин по одному следу принимается 6-8 раз (уточнить в результате опытного уплотнения).

Устройство инспекционного проезда

Вокруг отвала запроектирован инспекционный проезд из щебня фр. 40-120 мм, $t=0,5$ м.

Устройство проезда производится путем отсыпки грунта автосамосвалами с разравниванием и планировкой бульдозером. Уплотнение грунта производится грунтовым катком до $K_{упл.} = 0,92-0,95$. Ориентировочное число проходов уплотняющих машин по одному следу принимается 6-8 раз (уточнить в результате опытного уплотнения).

В пылеопасный период необходимо производить пылеподавление проезда поливочными машинами ПМ-130.

Устройство водосборных канав

Разработка грунта при устройстве канав производится гусеничным мини-экскаватором Hitachi ZX65USB 5A с ёмкостью ковша 0,25 м³. Разработанный грунт (золошлаки) грузится в автосамосвалы г/п 20 т, перевозятся на расстояние до 1 км и отсыпается в отвал.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Для сокращения сроков производства работ устройство водосборных канав №1 и №2 рекомендуется производить 2-мя экскаваторами.

Траншея разрабатывается с проектным уклоном к пруду-отстойнику, разработку грунта следует производить в направлении от пруда-отстойника. Зачистка дна траншеи до проектных отметок производится вручную.

Движение строительной техники при разработке канав осуществляется по инспекционному проезду.

Крепление дна и откосов водосборных канав от размыва обеспечивается покрытием из бетонного полотна (см. подраздел 10.4).

Устройство водосборных канав производить захватками длиной 50-100 м поточным методом, так, например, на одной захватке производится разработка грунта, на второй – укладка бетонного полотна.

Для пропуска воды под проездами укладываются водоперепускные трубы. Трубы укладываются при помощи автомобильного крана в траншею на подготовку из щебня фр. 20-40 мм и засыпаются грунтами выемки.

Разработка траншеи, отсыпка подготовки и обратная засыпка траншеи производится гусеничным экскаватором Hitachi ZX-240-3 с ёмкостью ковша 1,0 м³. Отсыпку грунта осуществлять послойно, слоями не более 0,5 м, с уплотнением виброплитой до $K_{упл.} = 0,92-0,95$.

Складирование золошлаков в насыпной отвал

Основание отвала подлежат экранированию. Технология устройства противофильтрационного экрана рассмотрена в подразделе 10.5.

Складирование золошлаков предусматривается в насыпной отвал, состоящий из 5 ярусов отсыпки. По периметру отвала на каждом ярусе отсыпается ограждающие насыпи из золошлаков.

Основные технические и организационно-технологические решения по разработке, перевозке и отсыпке золошлаков в отвал разработаны в составе раздела 5 подраздела 7 ПД «Технологические решения» (см. том 972-ИОС7) и в данном томе не рассматривались.

Под ограждающие насыпи отсыпается дренажный слой из песчано-гравийной смеси, $t=0,3$ м. По гребню ограждающих насыпей обустроиваются проезды из щебня фр. 40-120 мм, $t=0,3$ м. Для обеспечения возможности складирования золошлаковых материалов в отвал до проектных отметок по территории проектируемого отвала запроектированы временные проезды и съезды из щебня $t=0,2$ м по слою ПГС $t=0,3$ м.

Грунт отсыпается автосамосвалами КАМАЗ г/п 20 т с разравниванием и планировкой бульдозером. Уплотнение грунта катками не требуется, уплотнение грунта производится под действием движущейся по нему во время отсыпки строительной техники.

На откос 1:3 грунт укладывается путем надвигки грунта снизу-вверх бульдозером.

В пылеопасный период необходимо производить пылеподавление золошлаков и проездов поливомоечными машинами ПМ-130.

Для защиты от пыления поверхность захваток 1-4 яруса и внутренние откосы ограждающих насыпей укрываются слоем латексной эмульсии из латекса ВДСМ-КИ-01-03 по ТУ 2241-004-94229329-2015 и воды. Нанесение латекса производить при помощи поливомоечных машин ПМ-130.

Наружные откосы ограждающих насыпей и поверхность захваток 5 яруса укрываются слоем растительного грунта, $t=0,3$ м в рамках технического этапа рекультивации.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				

						972-ПОС	Лист
Изм.	Коп. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		35

Рекультивация

Рекультивацию предусматривается выполнить в два этапа: технический и биологический.

В ходе технического этапа рекультивации необходимо произвести укрытие поверхности растительным грунтом, $t=0,3$ м.

Растительный грунт отсыпается автосамосвалами КАМАЗ г/п 20 т с разравниванием и планировкой бульдозером. Уплотнение растительного грунта не производится.

На откос 1:3 грунт укладывается путем надвигки грунта снизу-вверх бульдозером.

Движение автосамосвалов по отсыпанному и спланированному растительному грунту запрещается. Укладку растительного грунта производить захватками, движение автосамосвалов организовать таким образом, чтобы исключить их заезд на готовую захватку (т.е. методом «на себя»).

Рекультивация прилегающей к отвалу территории также предусматривает засыпку водосборных канав грунтами подсыпки инспекционного проезда и засыпку пруда-отстойника золошлаками.

Засыпка водосборных канав производится при помощи срезки грунта инспекционного проезда бульдозером, с перемещением грунта до 10 м в водосборные каналы. Засыпка пруда-отстойника производится согласно разработанной технологии по разработке, перевозке и отсыпке золошлаков.

В ходе биологического этапа рекультивации необходимо произвести гидропосев трав с внесением удобрений. Гидропосев трав производить при помощи гидросеялки ДЭ-16.

Более подробно решения по рекультивации рассмотрены в составе раздела 12 ПД «Проект рекультивации» (см. том 972-ПР).

10.3 Монтажные и сварочные работы

Монтаж вагончиков при устройстве бытового городка и разгрузку строительных материалов и конструкций на строительную площадку производить краном, задействованном на основных работах.

Монтаж водоперепускных труб (стальная труба и сборная ж/б труба) производить автомобильным стреловым краном грузоподъемностью 16 т (КС-35719-1-02).

Подбор грузоподъемного крана для производства строительного-монтажных работ и расчет опасных зон, связанных с его применением, приведены в приложении Б.

Марку и грузоподъемность крана, а также размер опасных зон уточнить при разработке проекта производства работ исходя из фактических размеров монтируемых конструкций и применяемого такелажа.

При строповке стальной трубы необходимо принимать меры, предохраняющие антикоррозионную защиту от повреждения.

Для подъема, перемещения и укладки водоперепускных труб следует применять стропы с торцевыми захватами и мягкие полотноца. Сбрасывание труб с транспортных средств не допускается, монтаж осуществляется «с колес».

Перемещение, установка и работа автомобильного крана вблизи откоса разрешаются только за пределами призмы обрушения грунта на расстоянии, установленном организационно-технологической документацией. При отсутствии соответствующих указаний в проекте производства работ минимальное расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до ближайших опор машины допускается принимать по [8, п.7.2.4, табл.1].

Доставка звеньев сборной ж/б трубы до места монтажа производится бортовыми автомобилями КАМАЗ, стальной трубы – специальным автотранспортом (длинномером).

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						972-ПОС	Лист
							36
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		

Сборная ж/б труба обмазывается горячим битумом БН50/50 по ГОСТ 6617-76 за 2 раза по грунтовке из раствора битума в бензине состава 1:2. Для разогрева битума использовать котел битумный передвижной (например, БЭ-6/130).

Монтаж водомерных реек производить вручную, готовые участки из швеллеров устанавливаются в проектное положение и соединяются между собой по месту при помощи ручной дуговой сварки.

Сварочные работы производить сварочным аппаратом для электродуговой сварки (например, Ресанта САИ 250 ПРОФ).

При выполнении сварочных работ место сварки необходимо защищать от воздействия атмосферных осадков и пыли.

Сварные соединения выполнять согласно ГОСТ 14098-2014 и ГОСТ 5264-80. Каждое готовое сварное соединение подвергается тщательному контролю на соответствие требованиям ГОСТ. Контроль выполнения и требования к результатам сварочных работ по СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012.

Руководство сварочными работами и ведение "Журнала сварочных работ" должно осуществлять лицо, имеющее документ о специальном сварочном образовании или квалификационное свидетельство повышения квалификации по сварке.

Сварочные работы следует производить по утвержденному проекту производства сварочных работ (ППСР) или специальному разделу по сварке в общем проекте производства работ, технологическим картам (регламентам), входящим в комплект исполнительной документации.

При производстве сварочных работ необходимо соблюдать требования пожарной безопасности. Запрещается производить сварку в непосредственной близости от легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов для предотвращения их непроизвольного возгорания.

10.4 Крепление водосборных канав бетонным полотном

Для сбора и отведения поверхностного стока с территории отвала запроектированы две водосборные канавы. Защита дна и откосов водосборных канав от размыва обеспечивается покрытием из бетонного полотна Т8.

Бетонное полотно представляет собой гибкое полотно, пропитанное сухой бетонной смесью, затвердевающее при смачивании и формирующее прочный армированный водонепроницаемый слой бетона заданной формы. Бетонное полотно позволяет создавать бетонные конструкции без использования смешивающего оборудования.

Полотно бетонное выпускается в виде рулонов по СТО 56910145-025-2017. Ширина рулонов 1,0 м., 2,0 м., 2,5 м. и 5,0 м, длина до 40 м.

В связи с тем, что закрепляемая ширина водосборной канавы составляет более 5 м, необходимо применять поперечную укладку бетонного полотна (рулон раскатывается поперек траншеи). Для уменьшения стыков полотен рекомендуется использовать максимальную ширину рулонов.

Бетонное полотно гибкое, хорошо складывается и принимает форму любой траншеи или насыпи. Материал допускает крутые изгибы и приспосабливается к любой форме. Не затвердевшая ткань режется с помощью обычного ручного инструмента.

Поверхность, на которую укладывается бетонное полотно, должна быть сухой, очищенной от корней, камней и строительного мусора во избежание повреждения гидроизоляционного покрытия.

Поверхность основания грунта должна быть утрамбована с коэффициентом уплотнения не менее 0,9.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Раскатка бетонного полотна должна быть выполнена геомембраной вниз. Начало укладки необходимо выполнять с самой низкой точки поперек канавы. Слои полотна укладываются внахлест друг на друга по течению воды в канале (подобно укладке черепицы). Нахлест полотен должен быть не менее 10 см между слоями. Перекрывающийся стык создается в направлении потока воды.

Необходимое количество рабочих – 8 человек.

Подача рулонов к месту укладки осуществляется при помощи подъемного автокрана, фронтального погрузчика или другого устройства, которое позволяет поднимать рулоны.

Конструкция и прочностные характеристики бетонного полотна не предназначены для передвижения по её поверхности крупногабаритной техники.

Бетонное полотно перед увлажнением или крепежом нарезается с помощью строительного ножа. При резке незакрепленного бетонного полотна из-за возможного высыпания сухой бетонной смеси рекомендуется оставлять припуск в 15-20 мм. Полотно можно также разрезать с помощью механической дисковой пилы, самозатачивающегося ножа или ручной пилы.

В грунт бетонное полотно крепится с помощью анкеров. Длину анкеров и интервал следует подбирать с учетом состояния почв и целей применения.

Анкера следует устанавливать на стыках для фиксации смежных слоев и отсутствия свободного перемещения полотен. Крепится бетонное полотно к нижнему слою по углам в местах соединения со следующим слоем и при необходимости посередине.

Фиксация полотен бетонного полотна между собой выполняется с помощью саморезов из нержавеющей стали, длиной 50 мм, путем наложения двух тканей. Шаг между саморезами произвольный, в среднем 20-60 см.

Саморезы следует вкручивать на расстоянии 2-5 см от края стыка и устанавливать перед монтажом, но сразу же после увлажнения – цементная смесь внутри полотна схватится вдоль резьбы.

Если есть необходимость улучшить непроницаемость между слоями, при стыковке обрезанных кромок бетонного полотна материал отгибают в обратную сторону, образуя шарнирное соединение. Это позволяет скрывать обрезанную кромку.

Для улучшения непроницаемости стыка до стяжки полотен саморезом между слоями бетонного полотна наносится герметик с помощью монтажного пистолета.

После закрепления бетонное полотно смачивают водой с помощью поливальной машины разбрызгиванием до тех пор, пока полотно не станет ощутимо мокрым в течение нескольких минут после смачивания.

Для обеспечения достаточной гидратации бетонное полотно должно быть повторно опрыскано через 1 час после первой гидратации.

Возможен монтаж во время дождя.

Полотно окончательно застывает через 24 часа, но продолжает накапливать прочность.

В ходе работы с бетонным полотном следует учитывать, что после распыления воды, в течение 1-2 часа (в зависимости от температуры окружающей среды), бетонное полотно остается гибким. Не допускается направление струи воды с большим напором прямо на материал.

При жаркой погоде время работы с материалом сокращается. Материал, недостаточно насыщенный водой, может дольше затвердевать, при этом прочность материала уменьшится.

10.5 Устройство противофильтрационного экрана

Противофильтрационный экран запроектирован под отвалом сухого складирования золошлаков, а также по дну и откосам пруда-отстойника.

Взам. инв. №		Подп. и дата		Инва. № подл.								972-ПОС	Лист

В качестве противофильтрационного элемента применяется полимерная геомембрана. При экранировании пруда-отстойника геомембрана укрывается защитным слоем из песчано-гравийной смеси $t=0,5$ м, при экранировании основания золошлакоотвала геомембрана засыпается непосредственно золошлаками.

Работы по устройству противофильтрационного экрана производить захватками – поточно, т.е. на одной захватке производится укладка геомембраны, на другой ее засыпка. Размер захваток назначить в ППР. Ориентировочная интенсивность укладки геомембраны – 5000 м² в сутки 2-мя бригадами (уточнить в ППР).

Геомембрана доставляется до места укладки в рулонах бортовым автомобилем КАМАЗ г/п 5,5 т. Транспортные габариты рулона – 5,0х0,4х0,4 м. Размеры полотна (раскатанного рулона) составляют: ширина 5,0 м; длина 50,0 м.

Для разгрузки рулонов из кузова автомобиля используется погрузчик с насадкой «жало» или погрузочная машина, оснащенная траверсой с бобиной (например, экскаватор, погрузчик или автомобильный кран). В последнем случае бобина вдевается через отверстие в рулоне. Поднимающие цепи прикрепляются к свободным концам бобины и к траверсе. Необходимо следить за тем, что рулон находится в горизонтальном положении во время подъема.

Поднимающие цепи, прикрепленные к траверсе, должны быть рассчитаны на вес, не менее чем в два раза превышающий вес рулона. Траверса предотвращает трение поднимающих цепей о концы рулона и обеспечивает возможность его свободного вращения.

На основании, подготовленном под укладку геомембраны, не должно быть льда, снега, мусора, корней, растений, камней, и других предметов, которые могут механически повредить материал.

Укладку полимерной геомембраны производить согласно ТУ 2246-001-56910145-2014 и СН-551-82 «Инструкция по проектированию и строительству противофильтрационных устройств из полиэтиленовой пленки для искусственных водоемов».

Укладка полотнищ материала производится раскаткой рулона вручную или механизированным способом.

Раскатка механизированным способом предполагает использование фронтального погрузчика типа «Bobcat» или любого другого приспособления, оборудованного консольной штангой для подъема рулонов.

Погрузчик осуществляет движение назад и раскатывает материал впереди себя (методом «на себя»). Колеса укладчика не должны оставлять следы на основании глубиной более 12 мм.

Исходя из этого, выделяются два основных способа раскатки рулонов:

- раскатка с помощью подсобных рабочих из расчета 6-8 человек на звено (в зависимости от массы рулона);
- раскатка механизированным способом с привлечением подсобных рабочих из расчета 2-3 человека на звено.

Укладка материала должна осуществляться по подготовленному основанию свободно, без лишнего натяжения. Полотно равномерно распределяется по грунтовой поверхности, натягивается и выравнивается по всей длине и ширине, чтобы избежать появления складок.

Для исключения воздействия ветра и образования парусности одновременно с укладкой следует предусмотреть временную пригрузку полотнищ материала, например, мешками с песком.

Оборудование, которое может повредить материал, не должно заезжать на него. Заезд любого транспортного средства на полотнище, не укрытое защитным слоем грунта, запрещается.

Полотна геомембраны укладываются с перехлестом не менее 100-150 мм как в продольном, так и в поперечном направлении и соединяются между собой сварным швом.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				

						972-ПОС	Лист
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Величину перехлеста уточнить в ППР на основании применяемого метода сварки. Полотна должны раскатываться и лежать при сварке свободно, без натяжения.

Кромки свариваемых листов геомембраны в зоне бедующего шва очищаются от поверхностных загрязнений сухой ветошью. Очистку поверхности от окислов следует производить механическим способом: металлическим скребком, щеткой с жесткой щетиной, шлифованной бумагой с мелким шагом. Обработку следует производить не ранее, чем за 30 минут до начала сварочных работ.

Для сварки геомембраны применять современные устройства для сварки полимерных материалов (например, компании Leister). Сварка геомембран из полиэтилена может производиться двумя способами: контактной и экструзионной сваркой.

Контактная сварка заключается в использовании нагрева методом «горячего клина» или «горячего воздуха» положенных внахлест полотен геомембраны в месте их соприкосновения до температуры плавления пленки. Для совмещения геомембраны используют прижимные ролики. В итоге получается сварной шов (одинарный или двойной с проверочным каналом).

Контактная сварка может выполняться аппаратами горячего клина или посредством сварочных горелок (аппараты горячего воздуха), а также аппаратами комбинированного типа. Сварка осуществляется путем сжатия нагретых поверхностей. Давление на геомембрану передается с использованием коленчатого рычага через ведущие прижимные ролики.

Сварка горячим воздухом осуществляется с использованием сварочной горелки и прижимного валика. При сварке горячим воздухом нагреваемые поверхности геомембраны расплавляются, а затем прижимаются силиконовым валиком.

Сварка горячим клином применяется на всех протяженных и линейно ровных участках свариваемых поверхностей, сварка горячим воздухом – при выполнении криволинейных и труднодоступных швов.

При экструзионной сварке подача расплавленного полимера в зону сварки производится под давлением. Свариваемые поверхности переходят в вязко-текучее состояние, а затем за счет давления происходит сварка. Экструзионная сварка выполняется специальными аппаратами – экструдерами.

Принцип работы экструдера основан на расплавлении прутка из материала идентичного свариваемым, затем расплавленная масса под давлением подается на свариваемые поверхности надежно скрепляя их. Экструзионная сварка применяется для сложных и малодоступных участков, где невозможно применение контактной сварки (обработка углов, обварка сопряжений) или в случаях ремонта повреждений, возникших в период монтажа материала (установка заплаток).

Сварочные аппараты подключаются к дизельным генераторам.

Сварочные работы должны выполняться при температуре наружного воздуха не ниже минус 5 °С и при отсутствии атмосферных осадков. Некоторые производители не рекомендуют производить сварку геомембраны при температуре ниже плюс 5 °С.

В процессе производства работ по укладке геомембраны проводится проверка швов на прочность и герметичность. Сварные швы в обязательном порядке освидетельствуются актом на скрытые работы.

Все обнаруженные дефекты подлежат устранению. Устранение мелких отверстий диаметром до 10 мм, порывов и порезов длиной до 100 мм производится проклеиванием в 4-5 слоев лентой полиэтиленовой с липким слоем. Устранение дефектов, свыше указанных, надлежит осуществлять наложением заплат с помощью сварки.

В случае неблагоприятных погодных условий (экстремальные температуры, высокая влажность, дождь, сильный ветер и т.п.) запрещается разворачивать геомембрану. Не допускается оставлять полотнища геомембраны на ночь в развернутом виде и не сваренными между собой.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				

						972-ПОС	Лист
Изм.	Коп.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		40

При экранировании откосов пруда-отстойника необходимо разработать анкерные траншеи вдоль верхней бровки откоса для заделки геомембраны в грунт. Траншея разрабатывается при помощи мини-экскаватора Hitachi ZX65USB 5A с ёмкостью ковша 0,25 м³.

При укладке геомембраны на откос край полотнища опускается в анкерную траншею и фиксируется временным пригрузом из грунта, оставшаяся часть рулона вручную раскатывается вниз по откосу.

Работы по засыпке анкерной траншеи осуществляются только в сухую погоду. После засыпки анкерной траншеи производится освидетельствование с составлением Акта скрытых работ.

Полотна геомембраны при необходимости нарезаются до проектных размеров при помощи строительного ножа. В ППР необходимо разработать схемы раскладки полотнищ.

Устройство защитного слоя не должно отставать от работ по укладке и сварке в полевых условиях рулонов (полотнищ) более чем на 72 ч.

В грунте защитного слоя не должно быть льда, снега, камней, комьев грунта и других включений. Применение дробленых и естественных грунтов с крупнозернистыми частицами неокатанной формы не допускается.

Грунт к месту отсыпки доставляется автосамосвалами КАМАЗ г/п 20 т, укладывается отдельными кучами и разравнивается при помощи бульдозеров методом «от себя».

При этом не допускается заезд техники на открытую поверхность геомембраны. Материал отсыпки постепенно разравнивается за несколько проходов бульдозера с последовательной надвижкой материала на полотно.

Защитный грунт должен отсыпаться на геомембрану так, чтобы минимизировать нагрузки на материал, для этого толщина слоя грунта между гусеницами бульдозера и материалом должна быть не менее 0,3 м во избежание повреждения геомембраны.

Движение бульдозера при отсыпке и разравнивании защитного слоя грунта должно производиться вдоль соединительных швов, грунт не должен попадать в пространство между пленкой в местах нахлесточного соединения.

При устройстве защитного слоя на откосе движение бульдозеров по откосу допускается только снизу-вверх при условии, что крутизна откоса соответствует паспортным данным бульдозера.

При устройстве защитного слоя геомембраны толщиной не менее 0,5 м, проезд груженых автосамосвалов допускается осуществлять непосредственно по захватке, по уже отсыпанному и уплотненному грунту. Движение разрешено только прямолинейное, развороты техники допускаются исключительно за пределами рабочего участка.

Отсыпку грунта производить «с колёс», без промежуточного складирования на строительной площадке. При невозможности организации работ по отсыпке непрерывным потоком, необходимо организовать промежуточное складирование на строительной площадке.

После отсыпки и планировки защитного слоя грунта необходимо произвести его уплотнение катком до требуемой проектом плотности ($K_{упл.} = 0,92-0,95$). Отступление от заданных величин плотности допустимо только по согласованию с проектной организацией. Ориентировочное число проходов уплотняющих машин по одному следу принимается 6-8 раз (уточнить в результате опытного уплотнения).

Уплотнение грунтов должно производиться при влажности близкой к оптимальной. Допустимые отклонения от оптимальной влажности должны быть установлены техническими условиями и обычно принимаются в пределах $\pm 15-20\%$ ее значения.

При уплотнении карты одним катком уплотнение производится таким образом, чтобы следующий след заходил на предыдущий на 20-30 см. При укатке одновременно несколькими катками движение производится уступом с таким же перекрытием следов.

После завершения уплотнения следует производить опробирование качества уплотнения.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

							972-ПОС	Лист
								41
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата			

При производстве земляных работ использовать гусеничный бульдозер ДЗ-27С и грунтовый каток ДМ 62.

Работы по устройству противофильтрационного экрана должны выполнять специально обученные рабочие.

При экранировании основания отвала геомембрана выводится сверху на бетонное полотно водосборных канав. Вдоль водосборной канавы на участке шириной 5 м на геомембрану до отсыпки защитного слоя из ПГС укладывается гидромат 3D по СТО 56910145-005-2011 в качестве дренажа (в северной части отвала).

Дренажный мат укладывается путем раскатки рулонов вручную звеном из трех рабочих, перехлест полотен дренажного мата должен составлять не менее 0,2 м. Полотно равномерно распределяется по поверхности, натягивается и выравнивается по всей длине и ширине, чтобы избежать появления складок.

При наличии сильного ветра при необходимости использовать дополнительную пригрузку полотен материала, например, мешками с песком. Проезд строительной техники по открытому полотну не допускается.

10.6 Выполнение строительно-монтажных работ при низких температурах

При производстве земляных работ в зимнее время дополнительно следует выполнять следующие технические требования:

- Основание насыпи необходимо полностью очистить от льда и снега.
- Наличие снега и льда в насыпях и обратных засыпках не допускается. При обильных снегопадах и метелях все работы по отсыпке грунтов должны быть прекращены. Занесенную снегом поверхность ранее уложенного грунта перед продолжением работ следует очищать от снега.
- Отсыпка мерзлого грунта в ограждающие насыпи и защитный слой геомембраны запрещается, допускается укладывать только талый грунт. Отсыпку грунта разрешается проводить при условии недопущения смерзания грунта на карте до его уплотнения.
- Количество мерзлых комьев грунта не должно превышать 15% от общего объема укладываемого грунта. Размер мерзлых комьев не должен превышать 2/3 толщины уплотняемого слоя.
- В процессе возведения насыпей в зимнее время на месте работ следует вести наблюдения за t воздуха и грунта, поступающего на карту, температурным режимом грунта в процессе укладки, количеством мерзлых комьев, укладываемых в насыпь, количеством осадков, явлениями морозного пучения и трещинообразования грунта насыпи. Данные наблюдений заносятся в журнал производства работ.
- Вести наблюдение за общим состоянием насыпи как во время возведения, так и в весенне-летний период до полного оттаивания грунта, особое внимание обращая на деформации откосов и насыпи в целом, ее температурный режим.

Для возможности разработки мерзлых грунтов использовать дополнительное навесное оборудование на экскаватор – экскаваторный ковш для особо тяжелых условий применения либо гидромолот для предварительного рыхления грунта.

Производство бетонных работ при температуре ниже $+5^{\circ}\text{C}$ без проведения специальных мероприятий не допускается. К специальным мероприятиям относятся: применение противоморозных добавок, подогрев бетонной смеси, прогрев опалубки или бетона, устройство тепляков и др.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

							972-ПОС	Лист
								42
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

При производстве сварочных работ в зимнее время дополнительно следует выполнять следующие технические требования:

- Место сварки должно быть защищено от ветра, сквозняков и атмосферных осадков.
- Перед выполнением работ свариваемые детали очищаются от снега, инея и льда.
- Использованию подлежат только качественные, хорошо прокаленные электроды. Электроды следует хранить в отопляемом складе при температуре не ниже 15°C.
- Для сварки следует применять постоянный ток обратной полярности.
- Рекомендуется выполнять сварку на повышенных токах. Сварочный ток увеличивают по сравнению с расчетным на 1% при понижении температуры на каждые 3°C от 0°C.
- При температуре наружного воздуха ниже минус 20°C детали необходимо предварительно прогреть до 120-160°C в месте соединения на ширину до 100 мм по обе стороны будущего сварного шва.
- Сварка допускается до температуры не ниже минус 30°C, а при более низкой температуре (до -50°C) нужна специальная технология (сварка в тепляке и др.).

При устройстве противопыльчаточного экрана сварка геомембраны должна выполняться при температуре наружного воздуха не ниже минус 5°C и при отсутствии атмосферных осадков. Некоторые производители не рекомендуют производить сварку геомембраны при температуре ниже плюс 5°C. Сварку геомембраны при температуре ниже минус 5°C следует производить в строительных тепляках.

Особенности производства строительно-монтажных работ в зимнее время подробнее рассмотреть на стадии ППР.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

							972-ПОС	Лист 43
Изм.	Коп.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата			

11 ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ С СОСТАВЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ АКТОВ ПРИЕМКИ ПЕРЕД ПРОИЗВОДСТВОМ ПОСЛЕДУЮЩИХ РАБОТ И УСТРОЙСТВОМ ПОСЛЕДУЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность сооружения и для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ:

1 Подготовительные работы:

- расчистка территории и вырубка зеленых насаждений;
- разбивка осей сооружений.

2 Земляные работы:

- планировка гребней дамб до проектных отметок;
- отрывка траншей и котлованов;
- обратная засыпка выемок с послойным уплотнением;
- послойная отсыпка насыпей с уплотнением;
- устройство подготовки под водоперепускные трубы;
- устройство анкерной траншеи для крепления геомембраны;
- отсыпка защитного слоя геомембраны;
- планировка и уплотнение грунта.

3 Монтажные и сварочные работы:

- монтаж водоперепускной сборной ж/б трубы;
- монтаж водоперепускной стальной трубы;
- укладка и сварка геомембраны;
- укладка гидромата.

4 Прочие работы:

- крепление водосборных канав бетонным полотном;
- антикоррозионная защита металлоконструкций и сварных соединений;
- гидроизоляция бетонных конструкций;
- другие работы, согласно технических регламентов и нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.

Приведенный перечень носит рекомендательный характер и уточняется при разработке рабочей документации и проекта производства работ (ППР).

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

№ п/п	Наименование, характеристика	Марка	Всего, шт.	Назначение (использование по времени)
19	Автобетоносмеситель (ёмкость барабана 6 м³)	58146Т на шасси КАМАЗ 43118	1	Доставка и подача бетонной смеси при демонтаже шахтных водосбросов (1 день)
20	Бетононасос стационарный дизельный	СБ-207А	1	
21	Сварочный аппарат (мощность 5,5 кВт)	Ресанта САИ 190	1	Сварочные работы при демонтаже шахтных водосбросов (1 день)
22	Аппарат плазменной резки (мощность 7,5 кВт)	Мультиплаз- 7500	1	Резка металлоконструкций при демонтаже (3 дня)
23	УШМ (болгарка) (мощность 0,7 кВт)	ИНТЕРСКОЛ УШМ-125/700	2	
Основной период (Строительство отвала сухого складирования золошлаков)				
24	Автомобиль-самосвал (г/п 20 т)	КАМАЗ-6520	20	Перевозка и отсыпка грунта (2,5 мес.)
25	Автомобиль бортовой (г/п 5,5 т)	КАМАЗ-4308	2	Доставка материалов и конструкций, перевозка до места монтажа (9,0 мес.)
26	Кран автомобильный стреловой (г/п 16 т)	КС-35719-1-02 («Клинцы»)	1	Монтаж конструкций, погрузочно-разгрузочные работы (9,0 мес.)
27	Мини-погрузчик колесный	Bobcat S650	1	Вспомогательные работы (0,5 мес.)
28	Экскаватор гусеничный с обратной лопатой (с ёмкостью ковша 1,0 м³)	Hitachi ZX-240-3	2	Разработка котлована пруда-отстойника (1,5 мес.)
29	Мини-экскаватор гусеничный (с ёмкостью ковша 0,25 м³)	Hitachi ZX65USB 5А	2	Разработка анкерных траншей, разработка водосборных канав (1,0 мес.)
30	Бульдозер гусеничный (мощность 118 кВт – 160 л.с.)	ДЗ-27С	2	Разравнивание и планировка грунта (0,5 мес.)
31	Каток грунтовый самоходный (рабочий вес 14 т)	ДМ 62	1	Уплотнение грунта (0,5 мес.)
32	Виброплита электрическая (мощность 0,9 кВт)	ВУ-11-75	1	Уплотнение грунта в труднодоступных местах при обратной засыпке выемок (1 день)
33	Сварочный аппарат (мощность 5,5 кВт)	Ресанта САИ 190	1	Сварочные работы (при монтаже водомерных реек) (1 день)

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Коп. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

972-ПОС

Лист

47

Суточный расход воды на производственные потребности л/сут рассчитывается по формуле

$$Q_{\text{пр}} = K_{\text{н}} q_{\text{п}} P_{\text{п}},$$

где $q_{\text{п}}$ – удельный расход воды на производственного потребителя, л (заправка и мытье машин, приготовление растворов и бетона и т.п.);

$P_{\text{п}}$ – число производственных потребителей в наиболее загруженные сутки;

$K_{\text{н}} = 1,2$ – коэффициент на неучтенный расход воды.

Суточный расход воды на хозяйственно-бытовые потребности л/сут рассчитывается по формуле

$$Q_{\text{хоз}} = q_{\text{х}} P_{\text{р}} + q_{\text{д}} P_{\text{д}},$$

где $q_{\text{х}}$ – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего;

$P_{\text{р}}$ – численность работающих в наиболее загруженную смену, умноженная на количество смен в сутки;

$q_{\text{д}}$ – расход воды на прием душа одним работающим;

$P_{\text{д}}$ – численность рабочих в наиболее загруженную смену, пользующихся душем, умноженная на количество смен в сутки.

Суточная потребность в воде на период выполнения максимального объема строительного-монтажных работ приведена в таблице 12.6.

Таблица 12.6 – Потребность в воде

Наименование потребности	Удельный расход воды q , л	Число потребителей P в сут.	Потребность в воде, $\text{м}^3/\text{сут}$
Производственные нужды, в т.ч.: – заправка и мытье машин	500 л на 1 маш.	20 маш.	12,0
Хозяйственно-бытовые нужды, в т.ч.: – хоз.-питьевые потребности;	15,0 л на 1 чел.	35 чел. x 2 смены	2,31
– бытовые потребности (душевая)	30,0 л на 1 чел.	21 чел. x 2 смены	1,26
Итого:			14,31

Обеспечение водой на хозяйственно-бытовые нужды осуществляется ежесуточно, на производственные нужды – по мере необходимости.

Обеспечение водой для производственных и хозяйственно-бытовых нужд предусматривается привозной водой. Источник временного водоснабжения – привозная вода из сетей г. Ангарска. Дальность возки – 15 км. Воду подвозить автоцистерной по мере надобности. Для хранения воды на территории городка предусмотреть ёмкость $V=15 \text{ м}^3$.

Снабжение работающих питьевой водой, отвечающей санитарным нормам, производится посредством привозных емкостей (кулеров с бутилированной водой), располагаемых в санитарно-бытовых помещениях.

Образующиеся хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды собираются в специальную ёмкость $V=15 \text{ м}^3$ и регулярно вывозятся на канализационные очистные сооружения, расположенные в г. Ангарске, специализированной организацией.

Потребность в воде не учитывает потребность на пожаротушение. Расход воды для пожаротушения на период производства работ принимаем 5 л/сек согласно МДС 12-46.2008 [3].

Для пожаротушения использовать существующие пожарные гидранты.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

							972-ПОС	Лист
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			54

14 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО И ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ И ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, А ТАКЖЕ ПОСТАВЛЯЕМЫХ КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ

Согласно СП 48.13330.2019 «Организация строительства» [2], участники строительства должны осуществлять строительный контроль, предусмотренный законодательством РФ о градостроительной деятельности, с целью оценки соответствия СМР и возводимых конструкций требованиям технических регламентов, проектной и рабочей документации.

Для повышения качества строительной продукции Подрядчик обязан производить следующие виды контроля:

- входной контроль;
- операционный контроль;
- приемочный контроль;
- лабораторный контроль;
- геодезический контроль.

14.1 Входной контроль

Входному контролю подлежат вся представленная документация, включая ПОС и рабочая документация, все материалы и конструкции, поступающие на объект, а также разбивочная геодезическая основа.

При обнаружении недостатков соответствующая документация возвращается на доработку в срок, указанный в договоре.

Подрядчик выполняет приемку предоставленной ему Заказчиком геодезической разбивочной основы, проверяет ее соответствие установленным требованиям к точности, надежность закрепления знаков на местности. Приемку геодезической разбивочной основы следует оформлять соответствующим актом.

Входной контроль качества поставляемых на строительную площадку материалов, изделий и конструкций осуществляют внешним осмотром, их соответствием нормативным и проектным требованиям, а также проверкой паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов.

Входной контроль качества осуществляется работниками службы снабжения, инженерно-техническими работниками линейных технологических потоков или специалистами лабораторий контроля качества.

Результаты входного контроля должны быть документированы в журналах входного контроля и (или) лабораторных испытаний.

Материалы, изделия и конструкции, несоответствие которых установленным требованиям выявлено входным контролем, следует отделить от пригодных и промаркировать. Работы с применением этих материалов, изделий и конструкций следует приостановить.

14.2 Операционный контроль

Операционный контроль должен проводиться на объекте на протяжении всего производства работ для своевременного выявления дефектов и причин их возникновения и принятия мер по их устранению и предупреждению.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

							972-ПОС	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата			58

Операционным контролем Подрядчик должен проверять:

- соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций технологической и нормативной документации;
- соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям проектной и технологической документации.

Операционный контроль технологических процессов осуществляют производители работ и мастера на всех стадиях строительных работ, а специалисты службы контроля производят выборочный послеоперационный контроль.

Результаты операционного контроля должны быть документированы в журналах работ. Порядок ведения общего и специального журналов работ устанавливается РД-11-05-2007.

Контроль осуществляется производителем работ, представителем проектной организации (авторского надзора) и Заказчика с привлечением, при необходимости, соответствующей специализированной научно-исследовательской организации.

Контролируемые параметры и средства контроля, а также допустимые отклонения должны быть приведены в проекте производства работ в схемах операционного контроля качества строительно-монтажных работ.

Земляные работы

Основными контролируемыми параметрами при отсыпке грунта являются как геотехнические характеристики используемых грунтов, так и высота слоев отсыпки, режим работы применяемых машин и оборудования. Технические параметры применяемых машин и оборудования должны обеспечивать оптимальный режим их работы, установленный технологическими исследованиями.

В процессе отсыпки грунта на карты необходимо производить следующий контроль:

- за правильной технологией отсыпки грунта (распределением "куч" по площади карты, правильностью пионерной отсыпки, равномерностью движения грунтового транспорта при укатке отсыпаемого грунта проходящим транспортом и т.д.);
- за соблюдением толщины разравниваемого слоя и отсутствием скоплений крупных камней.

Укладка геосинтетических материалов

При укладке ГСМ контролируются следующие параметры:

- при визуальном осмотре – сплошность перекрытия поверхности земляного полотна материалом;
- правильность стыковки полотен, величина поперечного и продольного нахлеста полотен и отсутствие складок;
- отсутствие повреждений и подвижек материала при надвиге и уплотнении грунта;
- отсутствие участков чрезмерного натяжения материала;
- толщина защитного слоя грунта;
- наличие крупных и острых включений в контактирующих с материалом грунтовых слоях.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Сварка геомембраны

Контроль качества сварных швов геомембраны включает оценку следующих параметров:

- структуры шва (сварные наплывы должны быть ограничены по величине и не должны превышать толщину материала, а царапины и надрезы не должны превышать 10% толщины материала);
- прочности шва, для испытания на прочность которого используются образцы шва шириной 20-50 мм. Длина образца должна быть достаточной для проведения испытаний. Шов считается прочным, если вытягивание одного из соединенных материалов идет не по шву, и соединенные материалы не расходятся.

Контроль качества выполненных сварочных работ осуществляется несколькими способами. Первый заключается в проверке герметичности шва сжатым воздухом.

Для этого оба конца сварного шва герметизируются, а в контрольный канал вводится разметочная игла. Величина подаваемого давления зависит от температурных показателей поверхности геомембраны. На протяжении 10 минут падение давления допускается не более, чем на 10%. После проведенного испытания контрольное отверстие в обязательном порядке заваривается.

Второй способ базируется на основе применения вакуум-насоса. Поверхность проверяемого участка обрабатывается мыльным раствором, после чего на нем устанавливается вакуумный колпак с закрытым клапаном сброса давления.

Очень важно обеспечить плотное прилегание колпака к поверхности шовного соединения. После откачки воздуха на протяжении 15 секунд шов проверяется на отсутствие мыльных пузырей. При их полном отсутствии колпак переносится на новый участок с нахлестом в пределах 75 мм.

Третий способ базируется на разрушении взятых образцов, поскольку направлен на определение прочности сварного соединения. Для этого из шва вырезаются контрольные образцы, поврежденные участки завариваются заплатками из аналогичного материала.

Сварочные работы

При выполнении сварочных работ контроль внешним осмотром и измерениями является обязательной операцией и должен проводиться независимо от других неразрушающих методов контроля и всегда предшествовать им.

Внешний осмотр сварных соединений проводится по всей их длине для выявления несоответствия формы шва требованиям нормативно-технической документации и рабочих чертежей, трещин, наплывов, прожогов и других дефектов.

Измерения сварных соединений следует проводить, применяя увеличительные приборы и измерительные инструменты: лупы, штангенциркули, линейки, рулетки и наборы шаблонов для контроля геометрии и размеров швов.

При измерении сварных соединений проверяются: ширина и высота усиления сварного шва, катеты швов угловых, тавровых и нахлесточных соединений, длина и шаг прерывистых швов, высота чешуйчатости, величина нахлестки, размеры поверхностных дефектов сварных соединений и величина смещения кромок. Все измерения должны выполняться после контроля внешним осмотром либо параллельно с ним.

Результаты контроля заносятся в специальный журнал регистрации выполнения контроля сварных соединений внешним осмотром и измерениями.

В случае обнаружения недопустимых отклонений от требований нормативно-технической документации или рабочих чертежей при контроле внешним осмотром и измерениями сварные соединения после устранения дефектов должны быть вновь подвергнуты контролю.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

							972-ПОС	Лист
								60
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

14.5 Геодезический контроль

Геодезические работы следует выполнять с точностью и в объеме, обеспечивающем при размещении, разбивке и возведении объектов соответствие геометрических параметров проектной документации и требованиям нормативных документов.

Геодезический контроль включает определение действительного планового и высотного положения и положения относительно вертикали элементов, конструкций и частей сооружений как на стадии временного закрепления (операционный контроль), так и после окончательного их закрепления (приемочный контроль).

Производство геодезических работ, геодезический контроль точности геометрических параметров сооружения и исполнительные съемки входят в обязанности Подрядчика.

Разбивочные работы и исполнительные геодезические съемки производятся работниками геодезической службы строительной организации.

Геодезический контроль точности выполнения СМР осуществляется геодезической службой, а также инженерно-техническими работниками, непосредственно руководящими производством.

Инженер-геодезист строительной организации обязан:

- принимать от Заказчика разбивочную основу и выполнять разбивочные работы;
- осуществлять инструментальный контроль с занесением его результатов в общий журнал работ;
- своевременно выполнять исполнительные съемки, с составлением необходимой исполнительной документации;
- осуществлять выборочный контроль работ в части соблюдения точности геометрических параметров.

Организация геодезического контроля качества СМР возлагается на производственно-технический отдел строительной организации.

Проверку качества геодезического обеспечения на объекте выполняет геодезическая служба строительной организации по графику, увязанному со сроком выполнения СМР.

Контролируемые в процессе производства строительно-монтажных работ геометрические параметры сооружений, методы геодезического контроля, порядок и объем его проведения должны быть установлены проектом производства геодезических работ.

Все разбивочные работы, в том числе установка разбивочных знаков, должны фиксироваться в журналах геодезических работ с приложением чертежей, на которых указывают все разбивочные точки, закрепленные на территории.

В процессе работы особое внимание должно быть уделено защите разбивочных точек и реперов от повреждений и смещений.

Положение разбивочных линий и реперов в плане, а также правильность высотного положения знаков разбивки следует проверять не реже одного раза в месяц. При наличии обстоятельств, приводимых к изменению первоначального положения какого-либо знака разбивки, проверку надлежит производить немедленно.

Пункты и знаки геодезической разбивочной основы должны быть сохранены в течение всего периода производства работ и переданы заказчику при сдаче сооружений в эксплуатацию по акту с приложением схемы расположения знаков и их описания.

Разбивка вспомогательных линий сохраняется на время производства работ по постройке соответствующего элемента сооружения.

Все документы по плановым и высотным разбивкам, проверке опорных знаков, определению отметок элементов сооружений и проверке фактических размеров сооружений

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

							972-ПОС	Лист 62
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата			

15 ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УЧТЕНЫ В РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ НА ОСНОВАНИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, В СВЯЗИ С ПРИНЯТЫМИ МЕТОДАМИ ВОЗВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

При разработке рабочей документации и составлении проекта производства работ руководствоваться требованиями СП 48.13330.2019 «Организация строительного производства» [2], а также ведомственными строительными нормами на конкретные виды строительно-монтажных работ.

Состав и содержание ППР также регламентируются МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ» и МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ».

В документации ППР на строительном генеральном плане следует уточнить места размещения бытового городка, складских площадок, а также при необходимости указать места подключения к сетям по согласованию с Заказчиком.

В составе ППР подробно разрабатываются особые мероприятия по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности.

Сроки и технология производства работ уточняются и детализируются в ППР при разработке технологических карт и схем производства работ. Технологические карты составляются на все виды основных работ, изложенных в ПОС.

Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №		972-ПОС	Лист
											64

16 ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ЖИЛЬЕ И СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ПЕРСОНАЛА, УЧАСТВУЮЩЕГО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

В связи с тем, что при производстве работ планируется задействовать специалистов, проживающих в г. Ангарске и близлежащих населенных пунктах, дополнительной потребности по выделению жилья, обеспечению и социально-бытовому обслуживанию персонала, участвующего в строительстве, не возникает.

Строительство вахтового поселка не требуется. При необходимости обеспечения жильем приезжих специалистов используется жилой фонд близлежащих населенных пунктов.

Для санитарно-бытового обслуживания персонала на территории предприятия в зоне производства работ устанавливается временный бытовой городок.

Изм.	Коп.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	972-ПОС		Лист
											65

17 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА

При выполнении строительно-монтажных работ следует выполнять требования по охране окружающей среды, изложенные в СП 48.13330.2019 «Организация строительства» [2], а также в следующих нормативных документах:

- 1 Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [17].
- 2 Федеральный закон от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» [18].
- 3 СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий [19].
- 4 Водный кодекс Российской Федерации [20].
- 5 Земельный кодекс Российской Федерации [21].
- 6 Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» [22].
- 7 Другие правила и нормативные документы по охране окружающей среды, утвержденные и согласованные в установленном порядке органами государственного управления и надзора, в том числе Минстроем России.

Исполнитель работ обеспечивает безопасность работ для окружающей природной среды на всех этапах производства работ, при этом:

- предусматривает установку границ строительной площадки;
- обеспечивает уборку территории стройплощадки и пятиметровой прилегающей зоны; бытовой и строительный мусор, а также снег должны вывозиться в сроки и в порядке, установленном органом местного самоуправления;
- не допускается несанкционированное сведение древесно-кустарниковой растительности;
- исключается неорганизованное и беспорядочное движение техники и автотранспорта.

Основным мероприятием, ограничивающим отрицательное воздействие на окружающую среду, является применение только технически исправной техники с отрегулированной топливной аппаратурой, обеспечивающей минимально возможный выброс углеводородных соединений, а также применение новой техники, более совершенной в экологическом отношении и снабженной катализаторами выхлопных газов.

Всё оборудование и машины должны проходить регулярный контроль на содержание вредных веществ в выхлопных газах, при превышении допустимых норм выбросов транспорт и оборудование к работе не допускаются.

Кроме того, при производстве земляных работ в пылеопасный период в засушливые дни для максимального сокращения выбросов пылящих материалов необходимо производить их регулярный полив технической водой (пылеподавление). Также при необходимости осуществлять пылеподавление на проездах. Золошлаки для защиты от пыления укрываются слоем латексной эмульсии.

Изм. № подл.	Взам. инв. №
	Подп. и дата

							972-ПОС	Лист
								66
Изм.	Коп. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

Проектом рекомендуется осуществление следующих мероприятий, обеспечивающих уменьшение загрязнения атмосферы, воды и почвы в процессе производства работ:

- рекомендуется по возможности перевод строительных машин и двигателей внутреннего сгорания на электропривод;
- рекомендуется применять электроэнергию взамен твердого или жидкого топлива для разогрева материалов и воды, сушки помещений;
- следует применять герметичные емкости для перевозки бетонной смеси и строительных растворов;
- исключить хранение горюче-смазочных материалов (ГСМ) на участке работ;
- заправку строительной техники производить на близлежащих существующих АЗС;
- несамоходная строительная техника заправляется на площадке отстоя техники автотопливозаправщиком, оснащенным специальным раздаточным пистолетом;
- заправка всех транспортных средств ГСМ производится по «герметичным» схемам, исключающим попадание летучих компонентов в окружающую среду;
- межсменный отстой дорожно-строительной техники следует производить на площадке с твердым покрытием;
- площадка отстоя техники должна быть организована с покрытием из водонепроницаемых материалов (например, геомембрана);
- под стационарными механизмами оборудуются специальные поддоны, исключающие попадание топлива и масел в грунт;
- во избежание утечек горюче-смазочных материалов из строительных машин, механизмов и автомобилей, до производства работ допускаются только технически исправные строительные машины и механизмы;
- предусматривается установка автономных туалетных кабин (биотуалетов);
- не допускается разливов ГСМ вблизи водного объекта.

Отвал сухого складирования золошлаков располагается в непосредственной близости от водоохранной зоны реки Ангары (200 м). В связи с этим необходимо выполнять следующие дополнительные мероприятия, предотвращающие загрязнение водных объектов в период производства работ:

- в пределах водоохранной зоны запрещается размещение стоянок транспортных средств и строительных машин;
- в пределах водоохранной зоны не допускается складирование отходов и мусора;
- на территории строительной площадки необходимо хранить запас опилок для сбора проливов нефтепродуктов;
- ежедневно перед началом работ техника должна проходить осмотр на отсутствие подтеков нефтепродуктов;
- сброс загрязняющих вод в акваторию водоема запрещен;
- образующиеся хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды собираются в специальную ёмкость и регулярно вывозятся на канализационные очистные сооружения (КОС), расположенные в г. Ангарске, специализированной организацией;
- предусмотреть сбор поверхностного стока с площадок бытового городка и отстоя техники, складской площадки и площадки установки мусорных контейнеров путем устройства по периметру водосборных канав или лотков с уклоном не менее 0,002 в сторону ёмкости с последующей откачкой и вывозом на КОС;

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						972-ПОС	Лист
Изм.	Коп. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		67

- сбор и отвод поверхностного стока с территории строительной площадки производится за счёт спланированной территории золошлакоотвала с уклоном от реки для организации стока атмосферных осадков, по периметру будущего отвала устраиваются водосборные канавы для сбора и отвода осадков с поверхности отвала в запроектированный пруд-отстойник, с последующим использованием воды для пылеподавления во время отсыпки золошлаков в пылеопасные периоды года.

Все стационарные механизмы, работающие на двигателях внутреннего сгорания, устанавливаются на металлические поддоны для сбора масла, конденсата и дизельного топлива. Поддоны периодически очищаются, стоки вывозятся для утилизации на очистные сооружения.

При выезде автотранспорта со строительной площадки необходимо производить очистку колес от строительной грязи на специальной площадке с твердым покрытием, размещаемой на выезде, что предотвратит разнос грязи за пределы строительной площадки. Очистку осуществлять постом мойки колес. При положительной температуре необходимо применять пункт мойки колес оборотного водоснабжения (например, серии «Водяной»), при отрицательной температуре – установку для пневмомеханической очистки колес (например, серии «Водяной АЭРО»).

В процессе производства работ выполнять мероприятия, исключающие загрязнение площадки строительными отходами, мусором, сточными водами и токсичными веществами. Сжигание горючих отходов и строительного мусора на стройплощадке запрещается.

Для бытовых и строительных отходов предусматривается установка мусорных контейнеров. Отходы должны регулярно вывозиться с территории площадки на полигон отходов. Отходы демонтажа также подлежат вывозу с территории строительной площадки.

Отходы передаются согласно заключенным договорам специализированным организациям, имеющим лицензию на деятельность по обращению с отходами (см. том 972-ООС).

Транспортная схема вывоза отходов приведена в приложении А.

Все территории, используемые в процессе производства работ, должны по окончании работ приводиться в состояние пригодное для дальнейшего хозяйственного использования, а также производится разборка всех временных зданий и сооружений.

Контроль за соблюдением законов по охране окружающей среды и природы обязаны осуществлять руководители всех подразделений, ведущих работы на объекте. Ответственность за нарушение природоохранных мероприятий при выполнении строительномонтажных работ несет Подрядчик.

Подробный перечень мероприятий по охране окружающей среды приведен в разделе 8 ПД «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (см. том 972-ООС).

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Коп. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	972-ПОС	Лист
							68

18 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ РАБОТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА

Перед началом работ необходимо разработать мероприятия по обеспечению нормальных условий труда рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности, охраны труда и производственной санитарии.

Все строительно-монтажные работы, предусмотренные проектом, должны выполняться в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- «Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 № 883н [15].
- СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ» [7].
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» [8].
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» [9].
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 N 123-ФЗ [11].
- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 [12].
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» [13].
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок» [14].
- Другие правила и нормативные документы по охране труда и технике безопасности, утвержденные и согласованные в установленном порядке органами государственного управления и надзора, в том числе Минстроем России.

Ответственность за выполнение мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.

Ответственное лицо осуществляет организационное руководство строительными работами. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.

К строительно-монтажным работам разрешается приступать только при наличии проекта производства работ, в котором должны быть разработаны все мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии, обязательные для всех организаций, участвующих в работах.

К работам допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, инструктажи по охране труда, обучение по установленной программе, проверку знаний в квалификационной комиссии и имеющие удостоверение о проверке знаний установленного образца.

Допуск рабочих к выполнению работ разрешается только после их ознакомления (под подпись) с проектом производства работ и, в случае необходимости, с требованиями, изложенными в наряде-допуске на производство работ повышенной опасности.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

							972-ПОС	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			69

Общие мероприятия по технике безопасности и охране труда при производстве работ

Ответственность за соблюдение техники безопасности при эксплуатации машин и механизмов, за соблюдением требований безопасности труда при производстве работ возлагается на организацию, осуществляющую работы. Обучение, инструктаж и проверка знаний по технике безопасности должны быть оформлены документально (журналы инструктажа, протоколы по проверке знаний, удостоверения и т.п.).

Все лица, находящиеся на строительной площадке и на рабочих местах, должны быть обеспечены защитными средствами в соответствии с отраслевыми нормами. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски. Работники без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются.

Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха.

На объекте должны быть аптечки с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства оказания пострадавшим первой медицинской помощи.

Применяемые при производстве строительно-монтажных работ машины, оборудование и технологическая оснастка по своим характеристикам должны соответствовать условиям безопасного выполнения работ. Все машины и механизмы должны быть заземлены, а подводящий кабель защищен от механических повреждений.

Машины, механизмы и съемные грузозахватные приспособления до пуска в работу должны быть подвергнуты полному техническому освидетельствованию. В случаях нарушения требований техники безопасности, ставящих под угрозу безопасность персонала и оборудования, работы должны быть приостановлены.

Грузоподъемные работы выполняются согласно требованиям «Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденных приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 [13].

Погрузочно-разгрузочные работы выполняются согласно требованиям «Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов», утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.10.2020 № 753н [16].

К управлению строительными машинами и механизмами допускаются лица, имеющие соответствующие удостоверения (права) и прошедшие инструктаж по ТБ.

При выполнении работ по транспортированию грузов на автомобильном транспорте должны соблюдаться требования Правил дорожного движения. Скорость движения автотранспорта вблизи мест производства работ не должна превышать на прямых участках 10 км/ч, на поворотах – 5 км/ч.

Перед началом работ в условиях производственного риска необходимо выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ.

К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов относятся:

- места вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок;
- места вблизи от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более;
- места, где возможно превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

К зонам потенциально опасных производственных факторов следует относить:

- участки территории вблизи строящегося сооружения;
- ярусы сооружений в одной захватке, над которыми производятся работы (монтаж, демонтаж, ремонт конструкций и т.п.);
- зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих органов;

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						972-ПОС	Лист
							70
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

- места, над которыми происходит перемещение грузов кранами.

Места временного или постоянного нахождения работников должны располагаться за пределами опасных зон.

На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть установлены защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности.

На выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, должен быть выдан наряд-допуск.

Перечень мест производства и видов работ, где допускается выполнять работы только по наряду-допуску, должен быть утвержден руководителем организации, выполняющей работы.

Наряд-допуск выдается непосредственному руководителю работ (прорабу, мастеру и т.п.) лицом, уполномоченным приказом руководителя организации. Перед началом работ руководитель работы обязан ознакомить работников с мероприятиями по безопасности производства работ и оформить инструктаж с записью в наряде-допуске.

Запрещается производить какие-либо работы и находиться людям вблизи движущихся частей и рабочих органов машин, в границах опасной зоны, ограниченной радиусом действия, увеличенным на 5 м.

Опасные зоны производства работ (опасные зоны работы крана, зоны котлованов, траншей и т.п.) огораживаются сигнальной лентой.

На местах производства работ должны быть вывешены плакаты с графическим изображением схем строповки сборных элементов, а также таблица масс поднимаемых грузов и предельных вылетов крана.

Перемещение, установка и работа строительной техники вблизи выемок с неукрепленными откосами разрешается только за пределами призмы обрушения грунта на расстоянии, установленном организационно-технологической документацией. При отсутствии соответствующих указаний в проекте производства работ минимальное расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до ближайших опор машины допускается принимать по [8, п.7.2.4, табл.1].

Освещение строительной площадки должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.046-2014 «Нормы освещения строительных площадок» [10].

Размещение на строительной площадке складских площадок и проездов производится с учетом обеспечения требований безопасности производства работ, производственной санитарии и противопожарной безопасности. Склаживать материалы на рабочих местах следует так, чтобы они не создавали опасности при выполнении работ и не стесняли проходы.

Проезды и проходы к рабочим местам должны содержаться в чистоте и порядке, очищаться от снега и мусора, не загромождаться материалами и конструкциями. В зимнее время регулярно проводится скалывание льда, все места прохода персонала посыпаются песком.

В соответствии с требованиями СанПин зона производства работ должна быть обеспечена привозной питьевой водой, соответствующей всем санитарным нормам. Привозная вода должна быть доброкачественной и отвечать всем требованиям действующих санитарных правил и нормативов.

До начала производства основных строительного-монтажных работ строительная площадка должна быть оснащена первичными средствами пожаротушения, такими как щиты с набором противопожарного инвентаря и ящики с песком, а также огнетушителями согласно [11].

Курение разрешается только в специально отведенных и оборудованных местах. Также запрещается сжигание на стройплощадке отходов и строительного мусора.

Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №

В случае возникновения опасных природных процессов (сильный штормовой ветер, подтопление или затопление территории, землетрясение и др.) требуется немедленно прекратить производство всех строительных работ, а также предпринять необходимые меры для вывода людей и техники из опасной зоны.

Особые мероприятия по технике безопасности при эксплуатации строительных машин и транспортных средств

При размещении и эксплуатации машин, транспортных средств должны быть приняты меры, предупреждающие их опрокидывание или самопроизвольное перемещение под действием ветра, при уклоне местности или просадке грунта.

Перемещение, установка и работа машины, транспортного средства вблизи выемок с неукрепленными откосами разрешаются только за пределами призмы обрушения грунта на расстоянии, установленном организационно-технологической документацией.

При отсутствии соответствующих указаний в проекте производства работ минимальное расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до ближайших опор машины допускается принимать по [8, п.7.2.4, табл.1].

При разработке, транспортировании, разгрузке, планировке и уплотнении грунта двумя или более самоходными или прицепными машинами (скреперами, грейдерами, катками, бульдозерами), идущими одна за другой, расстояние между ними должно быть не менее 10 м.

При размещении автомобилей на погрузочно-разгрузочных площадках расстояние между автомобилями, стоящими друг за другом (в глубину), должно быть не менее 1 м, а между автомобилями, стоящими рядом (по фронту), не менее 1,5 м.

Место работы машин должно быть определено так, чтобы было обеспечено пространство, достаточное для обзора рабочей зоны и маневрирования. В случае, когда машинист или моторист, управляющий машиной, не имеет достаточную обзорность рабочего пространства или не видит рабочего (специально выделенного сигнальщика), подающего ему сигналы, между машинистом и сигнальщиком необходимо установить двустороннюю радиосвязь или телефонную связь. Использование промежуточных сигнальщиков для передачи сигналов машинисту не допускается.

Автомобили-самосвалы при разгрузке на насыпях, а также при засыпке выемок следует устанавливать не ближе 1 м от бровки естественного откоса. Места разгрузки автотранспорта должны определяться регулировщиком.

Автомобили-самосвалы должны быть снабжены специальными упорами для поддержания кузова в необходимых случаях в поднятом положении. Не допускается осуществлять техническое обслуживание автомобиля-самосвала с поднятым кузовом без установки упора кузова. Движение автомобилей-самосвалов с поднятым кузовом запрещается.

Подача автомобиля задним ходом в зоне, где выполняются какие-либо работы, должна производиться водителем только по команде лиц, участвующих в этих работах.

Особые мероприятия по технике безопасности при производстве работ бульдозером

При планировке отвалом бульдозера подъезд к бровке откоса следует осуществлять только ножом вперед. Подавать бульдозеры задним ходом к бровке откоса запрещается. При движении бульдозеры должны находиться вне призмы обрушения и не менее чем в двух метрах от бровки откоса. Расстояние от края гусеницы бульдозера до бровки откоса; определяется с учетом горно-геологических условий и должно быть занесено в паспорт ведения работ на отвале.

Переезд бульдозера своим ходом на другое место работы следует производить с поднятым в транспортное положение отвалом. Скорость движения бульдозера на пересеченной местности или по плохой дороге должна быть не выше второй передачи.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						972-ПОС	Лист
Изм.	Коп.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		72

При перемещении грунта бульдозером на подъеме необходимо следить за тем, чтобы отвал не врезался в грунт, уклоны участков не должны превышать указанные в паспорте машин.

Нельзя поворачивать бульдозер с загруженным или заглубленным отвалом.

При сбросе грунта под откос отвалом бульдозер не должен выдвигаться за бровку откоса насыпи.

В случае аварийной остановки бульдозера на наклонной плоскости должны быть приняты меры, исключающие самопроизвольное его движение под уклон.

При остановке бульдозера на длительный период необходимо заглушить двигатель, опустить отвал на землю и затормозить бульдозер.

Монтаж навесного оборудования бульдозера на трактор и демонтаж его разрешаются только под руководством механика или мастера, ответственного за производство этих работ.

Особые мероприятия по технике безопасности при производстве работ экскаватором

Площадка, на которую устанавливают экскаватор, должна быть хорошо спланирована и обеспечивать хороший обзор фронта работ.

Экскаватор, установленный на площадке, должен быть закреплен во избежание самопроизвольного его перемещения.

Вокруг экскаватора в радиусе, равном максимальному радиусу копания его плюс 5 м, устанавливают опасную зону, в которой нахождение людей во время работы экскаватора запрещается. На границе зоны должны быть установлены предупредительные знаки и плакаты, а в темное время - сигнальное освещение.

Спуск и подъем экскаватора при перемещении его своим ходом можно осуществлять на уклоне дороги, не превышающем максимально преодолеваемый угол подъема экскаватора согласно его техническому паспорту.

Спуск и подъем экскаватора своим ходом на уклоне дороги, превышающем указанный в паспорте, допускается производить при дополнительной помощи трактора или лебедки в присутствии механика, производителя работ или мастера.

Во время движения экскаватора его стрелу необходимо установить строго по направлению пути следования экскаватора, а ковш - приподнять над землей на высоту 0,5-0,7 м, считая от земли до нижней кромки ковша. Передвижение экскаватора с нагруженным ковшом не разрешается. Поворотная платформа должна быть заторможена.

Во время работы экскаватора запрещается менять вылет стрелы при заполненном ковше (за исключением лопат, не имеющих напорного механизма), подтягивать с помощью стрелы или ковша груз, расположенный сбоку. Запрещается регулировать тормоза при поднятом ковше.

Во время перерыва в работе, независимо от его продолжительности, стрелу экскаватора следует отвести в сторону от забоя, а ковш опустить на грунт.

Машинист обязан следить за состоянием забоя и, если возникнет опасность обрушения, немедленно отвести экскаватор в безопасное место и сообщить об этом производителю работ или мастеру.

Запрещается подъем и перемещение ковшом негабаритных кусков породы, бревен, досок, балок и др.

Запрещается подкладывать под гусеничные ленты или катки гусениц доски, бревна, клинья, камни и другие предметы для предотвращения смещения экскаватора во время работы. Для этой цели должны применяться исправные тормозные устройства ходового механизма.

Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

Грунт на автомобиль следует грузить со стороны заднего или бокового его борта. Категорически запрещается переносить ковш над кабиной шофера или людьми. Во время погрузки шофер должен выходить из машины, если кабина не имеет броневого щита.

Ковш при разгрузке грунта в автомобиль следует опускать как можно ниже, чтобы не повредить машину. Не допускается сверхгабаритная загрузка кузова автомобиля и неравномерное распределение грунта в нем.

Ковш разрешается чистить от налипшего грунта или застрявших в его зубьях предметов только во время остановки экскаватора, когда ковш опущен на землю.

Во время работы экскаватора запрещается кому бы то ни было (включая помощника машиниста) находиться на поворотной платформе, а также кому-нибудь (включая машиниста) переходить на другую сторону экскаватора через работающие механизмы.

Во избежание аварии до пуска экскаватора с поворотной платформы должны быть убраны все посторонние предметы. Весь необходимый для работы инвентарь и инструменты следует хранить в специально предназначенном для этой цели месте.

Особые мероприятия по технике безопасности при производстве монтажных работ

Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами конструкций и оборудования до установки их в проектное положение.

При необходимости нахождения работающих под монтируемыми конструкциями должны осуществляться специальные мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих.

Элементы монтируемых конструкций или оборудования во время перемещения должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими оттяжками.

До начала выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена сигналами между лицом, руководящим монтажом, и машинистом.

Все сигналы подаются только одним лицом (бригадиром, звеньевым, такелажником-стропальщиком), кроме сигнала "Стоп", который может быть подан любым работником, заметившим явную опасность.

Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи необходимо производить до их подъема.

Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, раскачивания и вращения.

Поднимать конструкции следует в два приема: сначала на высоту 20-30 см, затем после проверки надежности строповки производить дальнейший подъем.

При перемещении конструкций расстояние между ними и выступающими частями смонтированных других конструкций должно быть по горизонтали не менее 1 м, по вертикали - не менее 0,5 м.

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы конструкций на весу.

Установленные в проектное положение элементы конструкций должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и геометрическая неизменяемость.

Расстроповку элементов конструкций, установленных в проектное положение, следует производить после постоянного или временного их закрепления согласно проекту. Перемещать установленные элементы конструкций после их расстроповки, за исключением случаев использования монтажной оснастки, предусмотренных ППР, не допускается.

Запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при скорости ветра 15 м/с и более, при гололеде, грозе или тумане, исключающих видимость в пределах фронта работ.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				

						972-ПОС	Лист
Изм.	Коп.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		74

Особые мероприятия по технике безопасности при эксплуатации автомобильного крана

При производстве работ с применением грузоподъемных кранов должны соблюдаться следующие требования безопасности:

- краном могут быть подняты и перемещены только те грузы, масса которых не превышает грузоподъемности крана;
- перемещение груза неизвестной массы разрешается только после того, как определена фактическая его масса. Оценивать массу груза с помощью приборов безопасности крана не допускается;
- перемещение грузов, для которых не разработаны схемы строповки, должно производиться в присутствии и под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами;
- груз или грузозахватное приспособление при горизонтальном перемещении краном должны быть предварительно подняты не менее чем на 500 мм выше встречающихся на пути предметов;
- погрузка груза в транспортное средство должна производиться таким образом, чтобы не нарушалось его равновесие, а также обеспечивалась возможность безопасной строповки при разгрузке;
- в процессе производства работ крановщик обязан подавать звуковой сигнал перед началом каждой рабочей операции по перемещению груза, ГЗП или крюка крана;
- в процессе производства работ крановщик должен выполнять команды только стропальщика или руководителя работ. Исключение составляет только команда "Стоп", которую могут подавать любые лица, заметившие опасность;
- по окончании работ или перерыве грузозахватный орган крана должен быть освобожден от груза, а стрела крана должна быть переведена в транспортное положение.

При производстве работ с применением грузоподъемных кранов не допускается:

- нахождение людей возле работающего стрелового крана во избежание зажатия их между поворотной и неповоротной частями крана;
- перемещение груза при нахождении рядом с ним или под ним людей. Стропальщик может находиться возле груза во время его подъема или опускания, если груз находится на высоте не более 1000 мм от уровня земли;
- перемещение груза, находящегося в неустойчивом положении;
- перемещение людей или груза с находящимися на нем людьми;
- подъем груза, засыпанного землей или примерзшего к земле, заложеного другими грузами, укрепленного болтами или залитого бетоном;
- подъем груза, защемленного другими грузами;
- подтаскивание груза крюком крана при наклонном положении грузового каната;
- оттягивание груза при подъеме или опускании, а также при перемещении;
- выравнивание перемещаемого груза руками, а также поправка строп на весу;
- работа при отключенных или неисправных приборах безопасности и тормозах;
- опускать груз на транспортное средство или поднимать груз с него при нахождении людей в кузове или кабине;
- нахождение людей между поднимаемым (опускаемым) грузом и транспортным средством;

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

- поднимать груз неизвестной массы;
- поднимать груз с поврежденными строповочными узлами (петлями, рым-болтами и т.п.);
- оставлять груз на крюке крана продолжительное время;
- включение механизмов крана при нахождении людей на кране вне его кабины (на стреле, противовесе и т.п.). Исключение допускается для лиц, ведущих осмотр и регулировку механизмов, электрооборудования и приборов безопасности. В этом случае механизмы должны включаться по сигналу лица, производящего осмотр;
- нахождение людей под стрелой крана при ее подъеме и опускании без груза.

Особые мероприятия по технике безопасности при производстве сварочных работ

Места выполнения сварочных работ и размещения сварочного оборудования должны быть очищены от горючих материалов в радиусе не менее 5 м, а от легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов в радиусе не менее 10 м.

В электросварочных аппаратах и источниках их питания элементы, находящиеся под напряжением, должны быть закрыты оградительными устройствами. Провода, сварочные кабели, шланги, рукава, проведенные к рабочим местам, должны быть защищены от возможных механических повреждений и воздействия высокой температуры.

Электродержатели, применяемые при ручной дуговой электросварке металлическими электродами, должны соответствовать требованиям ГОСТ.

При выполнении сварочных работ на открытом воздухе во время осадков (дождя, снегопада и т.п.) источники питания следует размещать в передвижных машинных помещениях. При отсутствии передвижных машинных помещений или навесов над электросварочным оборудованием сварочные работы во время осадков должны быть прекращены.

Подробный перечень мероприятий, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда, разрабатывается в составе ППР.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	972-ПОС	Лист
										76

19 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТА В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительная площадка располагается на территории действующего охраняемого предприятия с контрольно-пропускным режимом. Охрана осуществляется ООО «Охранное предприятие «Иркутскэнерго».

Въезд на территорию предприятия осуществляется через охраняемый контрольно-пропускной пункт. Для обнаружения несанкционированного проникновения по территории установлены камеры видеонаблюдения, объезд территории осуществляется два раза в сутки.

Охрана непосредственно строительной площадки в период производства работ входит в обязанности Подрядчика.

В связи с тем, что предприятие расположено за пределами жилой зоны и проникновение посторонних лиц на территорию предприятия исключено, дополнительно огораживать стройплощадку забором по периметру не требуется.

Вокруг строительной площадки в местах подъездов и возможных подходов должны быть установлены плакаты: «Опасная зона. Проход и въезд посторонним лицам запрещен!». При въезде на строительную площадку установить КПП.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №					972-ПОС	Лист
								77
			Изм.	Коп.уч.	Лист	№док.		Подп.

20 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПУНКТОМ 8 ТРЕБОВАНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА НА ЭТАПЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА

Объект не относится к объектам транспортной инфраструктуры.

Проектные решения и мероприятия по реализации требований по обеспечению транспортной безопасности разрабатывать не требуется.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №					972-ПОС	Лист
								78
Изм.	Коп.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата			

21 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ СТРОЯЩЕГОСЯ ОБЪЕКТА

Строительство отвала сухого складирования осуществляется на территории золошлакоотвала участка №1 ТЭЦ-9.

До начала строительства проектом предусматриваются мероприятия по ликвидации существующих гидротехнических сооружений золошлакоотвала. Контроль (мониторинг) безопасности ГТС прекращается, технические средства контроля (пьезометры, поверхностные марки) демонтируются и утилизируются.

Осадочные марки секции № 4 (ОМ-7, ОМ-8, ОМ-9) не демонтируются. Данные марки будут использоваться для контроля осадок при заполнении и эксплуатации проектируемого отвала сухого складирования золошлаков.

Существующие ограждающие дамбы золошлакоотвала сохраняются, с частичной срезкой или подсыпкой гребня до отметок планировки поверхности золошлакоотвала, для защиты проектируемого насыпного отвала в случае возможного подъема уровня воды р. Ангары.

В связи с тем, что строительные работы, которые могут повлиять на техническое состояние существующих дамб, не производятся, мероприятий по организации мониторинга за их состоянием производить не требуется.

Изм.	Коп.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	972-ПОС		Лист
											79

22 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Продолжительность производства работ по реконструкции хвостохранилища определить по СНиП 1.04.03-85* [6] не представляется возможным, так как данный нормативный документ не содержит аналогичных объектов.

Продолжительность выполнения работ определяем исходя из технологической последовательности и трудоемкости работ, на основании расчетов и опыта строительства.

22.1 Подготовительный период

Продолжительность общеплощадочных подготовительных работ принимаем – **0,5 мес.**

Подготовка территории

В рамках подготовительного периода также необходимо произвести подготовку территории золошлакоотвала (ЗШО) участка №1 ТЭЦ-9 к строительству отвала сухого складирования золошлаков.

Подготовка территории включает в себя:

- 1 Ликвидация ГТС, расчистка территории (демонтаж) и вырубка зеленых насаждений.
- 2 Планировка гребней дамб до отметок планировки поверхности золошлакоотвала.
- 3 Укрытие поверхности золошлакоотвала латексной эмульсией.

Продолжительность ликвидации ГТС, расчистки территории и вырубки зеленых насаждений принимаем исходя из технологической последовательности и трудоемкости работ – 0,5 мес.

Продолжительность планировки гребней дамб назначаем исходя из продолжительности земляных работ по разработке грунта.

Разработка грунта предусмотрена экскаватором с обратной лопатой объемом ковша 1,5 м³ с эксплуатационной производительностью 115 м³/ч.

Продолжительность работ определяем исходя из объема работ по разработке грунта и эксплуатационной производительности экскаватора по формуле

$$T = \frac{V}{P_{\text{эк}} \cdot t \cdot m \cdot n} \cdot K = \frac{50000}{115 \cdot 8 \cdot 2 \cdot 22} \cdot 1,2 = 1,5 \text{ мес.},$$

где V – объем земляных работ, м³;

$P_{\text{эк}}$ – эксплуатационная производительность экскаватора, м³/ч;

t – продолжительность смены, часов;

m – количество смен в сутки;

n – количество рабочих дней в месяце;

K – коэффициент, учитывающий увеличение продолжительности при организации работ параллельными потоками (разработка грунта → погрузка грунта → подсыпка гребня в понижениях либо транспортировка на складскую площадку).

Продолжительность укрытия поверхности золошлакоотвала латексной эмульсией назначаем исходя из производительности поливовой машины с объемом цистерны 6000 л – 22 т/смену при дальности возки 15 км.

Продолжительность работ определяем исходя из объема работ по поливу и производительности поливовой машины по формуле

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

							972-ПОС	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			80

$$T = \frac{V}{\Pi \cdot m \cdot n} = \frac{960}{22 \cdot 2 \cdot 22} = 1,0 \text{ мес.},$$

где V – объем работ по поливу, т;

Π – производительность поливовой машины, т/смену;

m – количество смен в сутки;

n – количество рабочих дней в месяце.

Производство строительного-монтажных работ планируется осуществлять в 2 смены продолжительностью 8 ч.

Для сокращения сроков производства подготовительных работ, работы по подготовке территории следует производить независимыми параллельными потоками.

Общая продолжительность работ по подготовке территории с учетом производства работ независимыми параллельными потоками составит **1,5 месяцев**.

22.2 Основной период

К работам основного периода разрешается приступать только после окончания всех работ подготовительного периода.

Строительство отвала сухого складирования золошлаков производится в следующей последовательности:

- 1 Устройство пруда-отстойника с экранированием.
- 2 Устройство водосборных канав и инспекционного проезда.
- 3 Устройство противофильтрационного экрана основания отвала.
- 4 Складирование золошлаков в насыпной отвал.

Для организации сбора и отвода поверхностного стока с территории ЗШО в первую очередь производится устройство пруда-отстойника и водосборных канав.

Устройство противофильтрационного экрана основания производится в процессе отсыпки 1 яруса отвала (по мере готовности захваток).

Складирования золошлаков в насыпной отвал возможно начинать сразу после окончания работ по устройству пруда-отстойника и водосборных канав, при условии того, что будет экранировано основание отвала на рабочей захватке.

Производство строительного-монтажных работ планируется осуществлять в 2 смены продолжительностью 8 ч.

Устройство пруда-отстойника

Продолжительность устройства пруда-отстойника назначаем исходя из продолжительности земляных работ по разработке котлована. Укладка геомембраны и отсыпка защитного слоя производится параллельными потоками, с небольшим отставанием.

Для сокращения сроков производства работ, разработка грунта предусмотрена 2-мя экскаваторами с обратной лопатой объемом ковша 1,0 м³ с эксплуатационной производительностью 80 м³/ч каждый.

Продолжительность работ определяем исходя из объема работ по разработке грунта и эксплуатационной производительности экскаваторов по формуле

$$T = \frac{V}{\Pi_{\text{ЭК}} \cdot t \cdot m \cdot n} \cdot K = \frac{71050}{(80 \cdot 2) \cdot 8 \cdot 2 \cdot 22} \cdot 1,2 = 1,5 \text{ мес.},$$

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							972-ПОС	Лист
										81
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

2 Рекультивация поверхности насыпного отвала:

- 1 ярус – 18 дней;
- 2 ярус – 19,5 дней;
- 3 ярус – 19,6 дней;
- 4 ярус – 19,2 дней;
- 5 ярус – 177 дней.

3 Рекультивация прилегающей к отвалу территории – 62,65 дней.

Общая продолжительность технического этапа рекультивации составит **17,5 месяцев**, при количестве рабочих дней в месяце – 22.

Продолжительность биологического этапа рекультивации составит:

1 Рекультивация территории ЗШО, попадающей в ВОЗ – 32,8 дня.

2 Рекультивация поверхности насыпного отвала:

- 1 ярус – 8,6 дней;
- 2 ярус – 9,3 дней;
- 3 ярус – 9,4 дней;
- 4 ярус – 9,0 дней;
- 5 ярус – 84 дня.

3 Рекультивация прилегающей к отвалу территории – 29,6 дней.

Общая продолжительность биологического этапа рекультивации составит **8,3 месяцев**, при количестве рабочих дней в месяце – 22.

Технический и биологический этапы рекультивации участка в водоохранной зоне р. Ангара производятся в первую очередь, на этапе подготовки территории к складированию золошлаков.

Технический и биологический этапы рекультивации поверхности отвала производится в процессе его отсыпки (по мере готовности захваток). Поэтому сроки проведения данных работ будут растянуты во времени.

Технический и биологический этапы рекультивации прилегающей к отвалу территории производится после полной рекультивации отвала.

Биологический этап рекультивации необходимо производить в теплый период года.

22.4 Общая продолжительность выполнения работ

Общая продолжительность выполнения работ определена исходя из технологической последовательности и параллельности работ согласно календарному графику производства работ, приведенному на листе 1 графической части.

Общая продолжительность выполнения работ по строительству отвала сухого складирования золошлаков (без учета рекультивации) составит **189,5 месяцев/15,8 лет**, в т.ч.:

- подготовительный период – 2,0 месяцев;
- основной период – 187,0 месяцев/15,6 лет.

Общая продолжительность выполнения работ с учетом рекультивации – **198 месяцев/16,5 лет**.

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.							Лист
			972-ПОС						
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1 Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
- 2 СП 48.13330.2019 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004. – Действ. с 25.06.2020.
- 3 МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ.
- 4 МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ.
- 5 Расчетные нормативы для составления проектов организации строительства.
- 6 СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. – Действ. с 01.01.1991.
- 7 СП 12-136-2002 Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ. – Действ. с 01.01.2003.
- 8 СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. (СП 49.13330.2010) – Действ. с 01.09.2001.
- 9 СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. – Действ. с 01.01.2003.
- 10 ГОСТ 12.1.046-2014 ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок. – Действ. с 01.07.2015.
- 11 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 N 123-ФЗ.
- 12 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.
- 13 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461.
- 14 ПУЭ Правила устройства электроустановок. Издание седьмое. – Утв. Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 №204.
- 15 Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 № 883н.
- 16 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.10.2020 № 753н.
- 17 Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
- 18 Федеральный закон от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».
- 19 СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. – Действ. с 01.03.2021.
- 20 Водный кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006 г. № 74-ФЗ.

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.							Лист
			972-ПОС						
			Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

21 Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ.

22 Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

23 СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 (с Изменениями №1, 2, 3). – Действ. с 28.08.2017.

24 СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменением №1, 3, 4). – Действ. с 01.07.2013.

25 СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 (с Изменением №1, 2). – Действ. с 20.06.2019.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	972-ПОС						Лист
															86

Приложение Б

Подбор грузоподъемного крана для производства строительного-монтажных работ. Расчет опасных зоны, связанных с применением грузоподъемного крана

Потребность в грузоподъемном механизме возникает при монтаже водоперепускных труб. Монтажу подлежат стальная труба и сборная ж/б труба, состоящая из звеньев.

Габариты стальной трубы: $\varnothing 1020 \times 8$ мм по ГОСТ 10704-91 длиной 15 м.

Габариты сборной ж/б трубы: ширина – 1,74 м; высота – 2,33 м; общая длина – 14 м (6 звеньев средней части длиной 2 м каждое и 2 звена оголовка длиной 1 м каждое).

Подбор грузоподъемного крана

Подбор грузоподъемного крана производим согласно РД-11-06-2007 для наиболее тяжелого элемента.

Наиболее тяжелый элемент – звено ж/б трубы массой 5,6 т (средняя часть ЗП.200-М).

Требуемая грузоподъемность крана определяется исходя из массы конструкции с учетом массы необходимых грузозахватных приспособлений.

1. Требуемую наибольшую грузоподъемность крана определяем по формуле

$$Q = (m_{гр} + m_{гр.пр}) \cdot k = (5,6 + 0,2) \cdot 1,2 = 7,0 \text{ т},$$

где $m_{гр}$ – масса поднимаемого груза, т;

$m_{гр.пр}$ – масса грузозахватных приспособлений, т;

k – коэффициент запаса грузоподъемности.

2. Требуемый наибольший рабочий вылет определяем по формуле

$$R_p = S + a + 0,5 \cdot B = 2,85 + 3,08 + 0,5 \cdot 1,74 = 6,8 \text{ м (см. Рисунок Б. 3)},$$

где S – расстояние от оси крана до бровки откоса, м (с учетом производства работ с выносными опорами);

a – расстояние от бровки откоса до трубы, м;

B – ширина трубы, м.

Исходя из требуемого рабочего вылета и требуемой грузоподъемности на данном вылете, для монтажа водоперепускных труб принимаем автомобильный стреловой кран КС-35719-1-02 г/п 16 т (с противовесом 4 т).

Грузовысотные характеристики крана приведены на рисунке Б.1, технические характеристики – в таблице Б.1.

Марку и грузоподъемность крана уточнить на стадии разработки ППР исходя из фактических размеров монтируемых конструкций и стоянок крана, а также применяемых грузозахватных приспособлений.

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Коп. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	972-ПОС	Лист
						88	

Таблица Б.1 – Технические характеристики крана КС-35719-1-02

Параметр	Значение
Грузоподъемность максимальная, т	16
Максимальный грузовой момент, т*м	60
Длина стрелы, м	19
Максимальный вылет (основная стрела), м	18,0
Максимальная высота подъема крюка (основная стрела), м	19,4
Максимальная глубина опускания крюка, м	11,0
Зона работы крана, град	360
Максимальная масса телескопируемого груза, т	4,0
Размер опорного контура при выдвинутых балках выносных опор, м	5,4x4,7
Максимальная масса противовеса, т	4
Набор противовесов, т	1,0+3,0

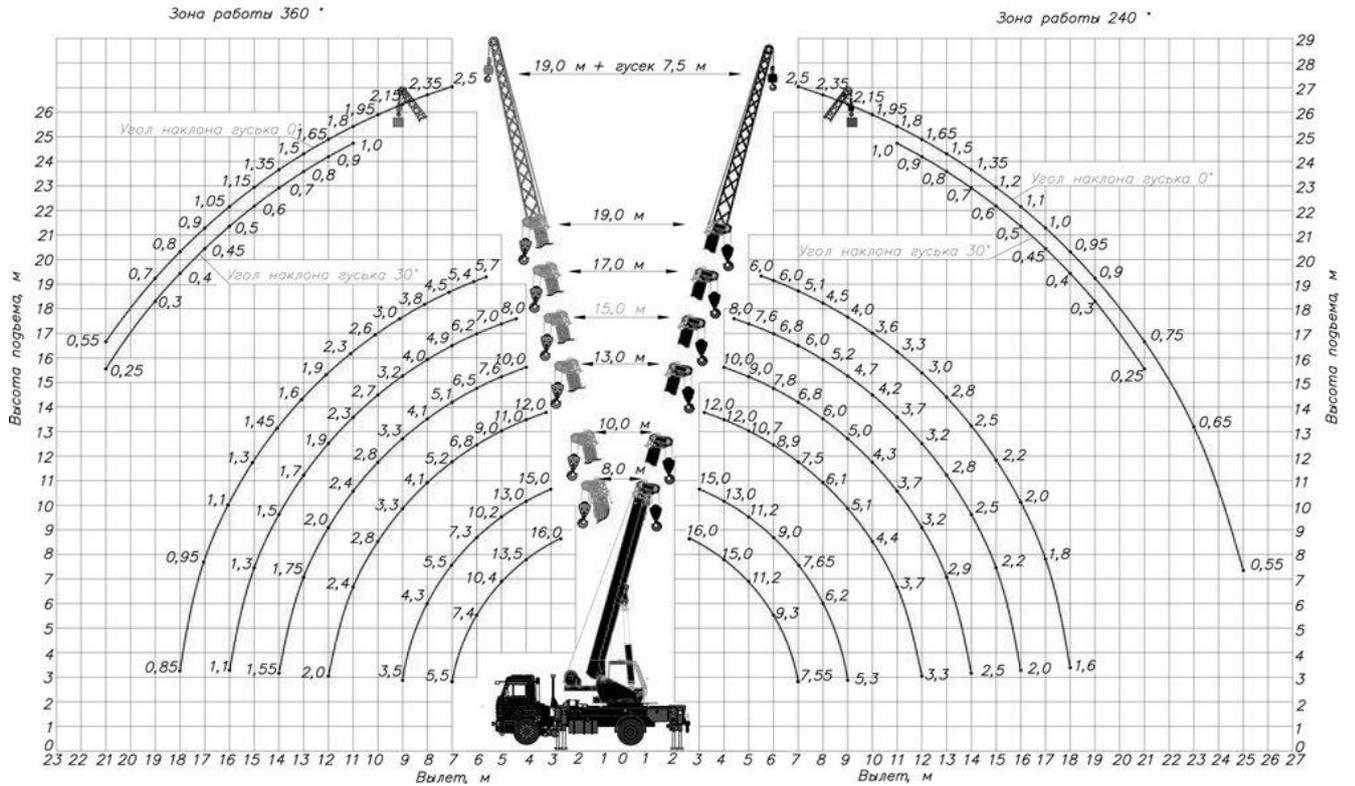


Рисунок Б.1 – Грузовысотные характеристики крана КС-35719-1-02 (характеристики приведены для крана с противовесом 4 т)

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
------	---------	------	--------	-------	------

Расчет опасных зон

Граница опасной зоны определяется по методике согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», приложение Г [8].

Граница опасной зоны в местах, над которыми происходит перемещение грузов подъемными кранами рассчитывается по формуле

$$R_{\text{оп}} = R_p + 0,5 \cdot B_r + L_r + x,$$

где R_p – наибольший рабочий вылет крюка крана;

B_r – наименьший габарит перемещаемого груза, м;

L_r – наибольший габарит перемещаемого груза, м;

x – минимальное расстояние отлета груза при его падении, м.

Минимальное расстояние отлета груза при его падении принимается согласно ([8], табл. Г1). При промежуточных значениях высоты возможного падения грузов минимальное расстояние их отлета допускается определять методом интерполяции или по графику, приведенному ниже (Рисунок Б.2).

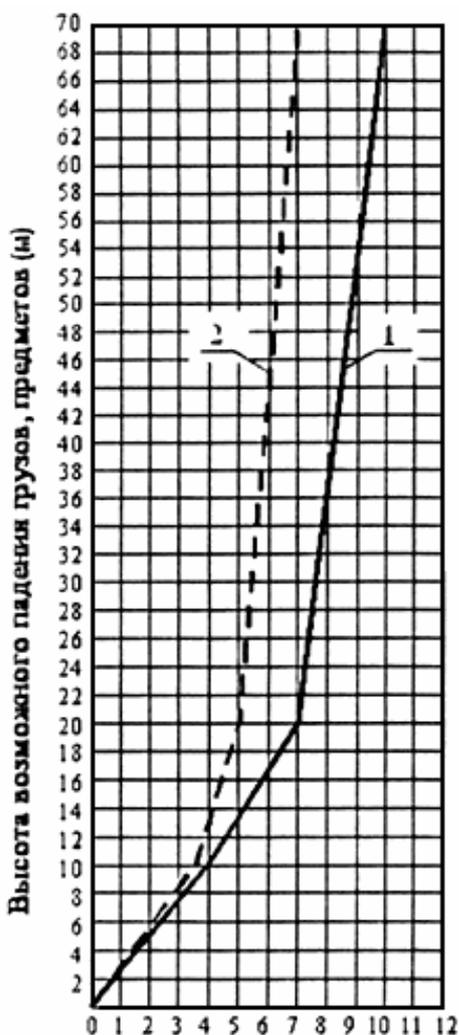


Рисунок Б.2 – График определения минимального расстояния отлета груза при его падении

(1 – при перемещении кранами груза в случае его падения; 2 – в случае падения предметов со здания)

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Высота возможного падения труб при их перемещении автомобильным краном из кузова автотранспорта в траншею не будет превышать 5 м, следовательно, расстояние отлета груза при падении с крюка крана принимаем 2,0 м согласно графику.

Наибольшую опасную зону работы крана КС-35719-1-02 г/п 16 т при монтаже звеньев сборной ж/б водоперепускной трубы принимаем:

$$R_{оп1} = 6,8 + 0,5 \cdot 1,74 + 2,33 + 2,0 = 12,0 \text{ м (см. Рисунок Б. 3).}$$

Наибольшую опасную зону работы крана КС-35719-1-02 г/п 16 т при монтаже стальной водоперепускной трубы:

$$R_{оп2} = 5,36 + 0,5 \cdot 1,02 + 15,0 + 2,0 = 22,87 \text{ м (см. Рисунок Б. 4).}$$

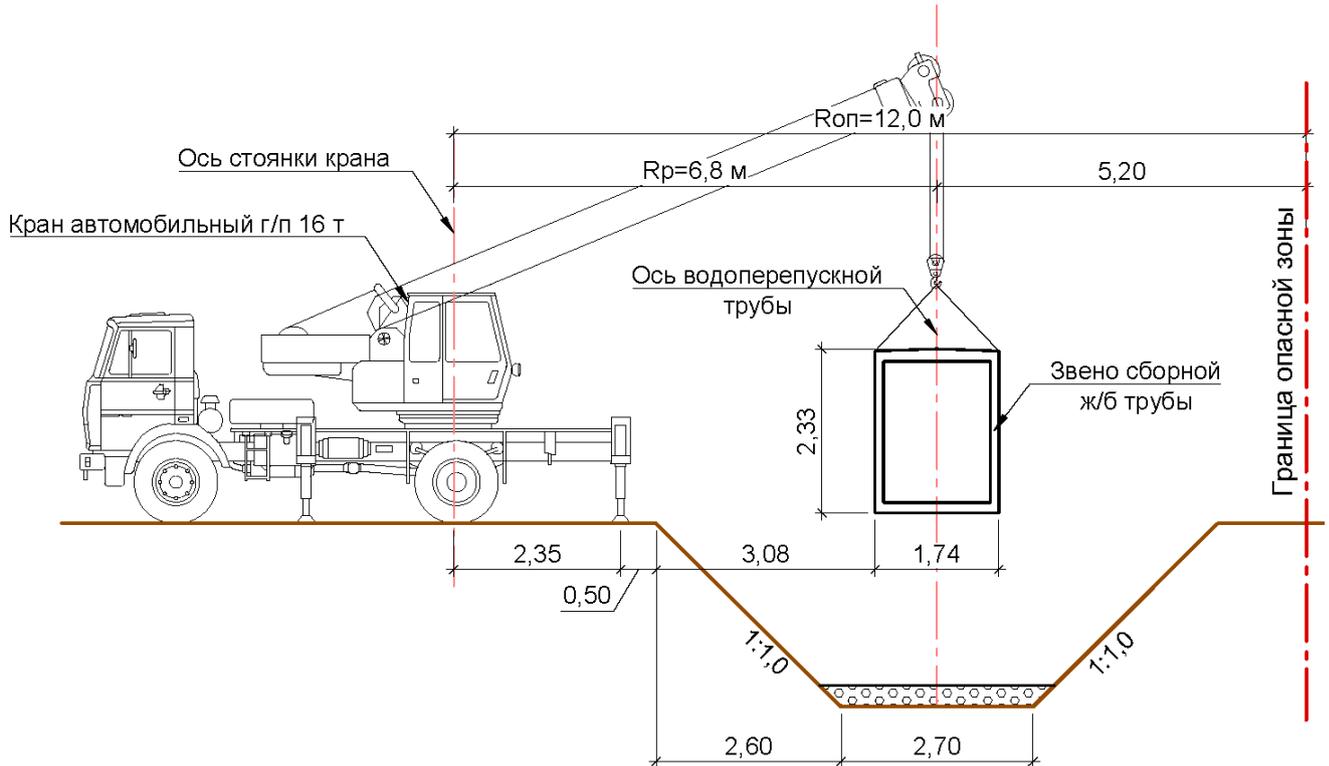


Рисунок Б.3 – Граница опасной зоны работы крана при монтаже звеньев сборной ж/б водоперепускной трубы

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №					972-ПОС	Лист
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.		

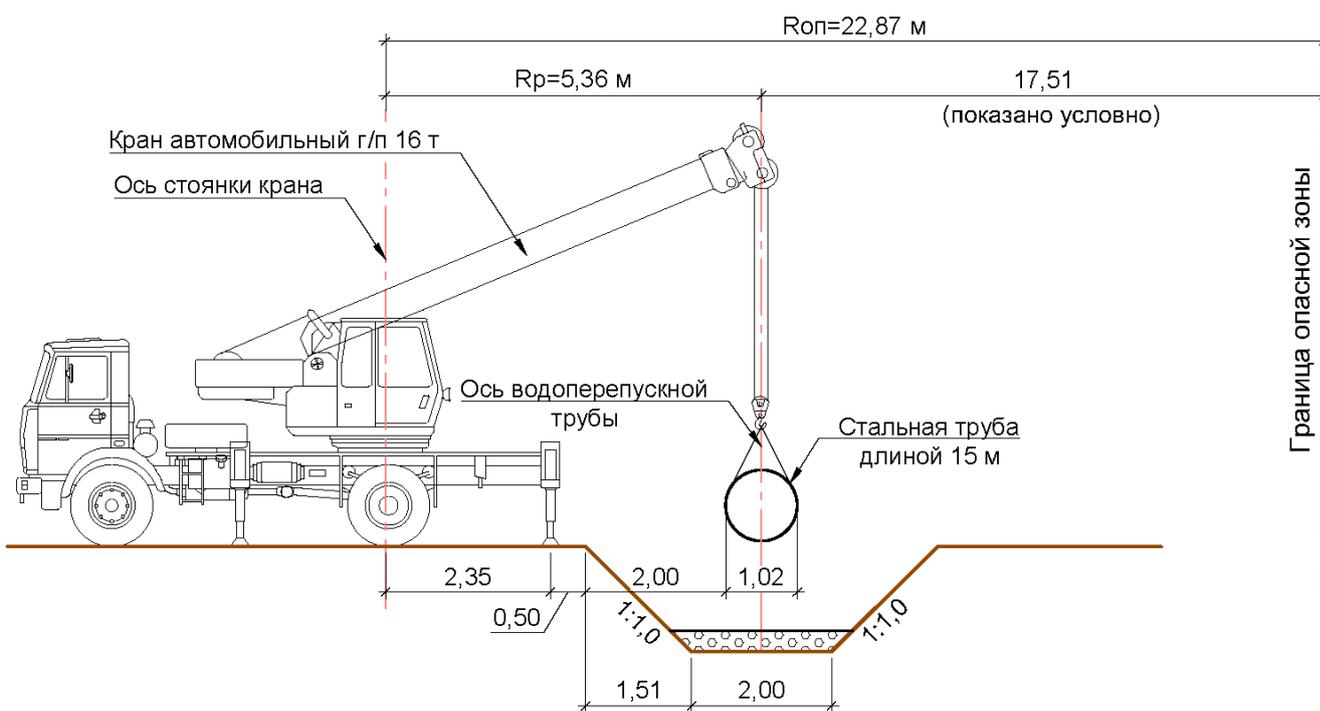


Рисунок Б.4 – Граница опасной зоны работы крана при монтаже стальной водоперепускной трубы

Размеры и границу опасных зон уточнить на стадии разработки ППР исходя из фактически применяемых кранов, мест их установки и габаритов монтируемых элементов.

Нахождение людей в опасной зоне во время монтажа строго запрещается. По периметру данной зоны необходимо выставить сигнальное ограждение и соответствующие знаки.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Наименование отдельных сооружений, этапов или видов работ	Продолжительность, мес.	Сроки выполнения работ*																																	
			1 год												2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	8 год	9 год	10 год	11 год	12 год	13 год	14 год	15 год	16 год	17 год						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																1	2	3	4	5	6	7
I	Подготовительный период	2,0	█																																	
1.1	Общеплощадочные подготовительные работы	0,5	█																																	
1.2	Подготовка территории:	1,5																																		
	Ликвидация ГТС, расчистка территории (демонтаж) и вырубка зеленых насаждений	0,5	█																																	
	Планировка гребней дамб до отметок планировки поверхности золошлакоотвала	1,5	█																																	
	Укрытие поверхности золошлакоотвала латексной эмульсией	1,0	█																																	
II	Основной период	187,0 (15,6 лет)																																		
2.1	Устройство пруда отстойника с экранированием	1,5							█																											
2.2	Устройство водосборных канав и инспекционного проезда:	1,5																																		
	Инспекционный проезд	0,5							█																											
	Водосборные канавы	1,0							█																											
2.3	Устройство противофильтрационного экрана основания отвала	7,0							█																											
2.4	Складирование золошлаков в насыпной отвал	184,5 (15,38 лет)							3,7 года 1 ярус			3,45 года 2 ярус			3,1 года 3 ярус			2,75 года 4 ярус			2,38 года 5 ярус															
III	Рекультивация	25,8																																		
3.1	Технический этап:	17,5																																		
	Рекультивация территории ЗШО, попадающей в ВОЗ	3,2	█																																	
	Рекультивация поверхности насыпного отвала	11,5							0,8 1 ярус		0,9 2 ярус		0,9 3 ярус		0,9 4 ярус		8,0 5 ярус																			
	Рекультивация прилегающей к отвалу территории	2,8																									█									
3.2	Биологический этап:	8,3																																		
	Рекультивация территории ЗШО, попадающей в ВОЗ	1,5				█																														
	Рекультивация поверхности насыпного отвала	5,5							0,4** 1 ярус		0,4** 2 ярус		0,4** 3 ярус		0,4** 4 ярус		3,9** 5 ярус																			
	Рекультивация прилегающей к отвалу территории	1,3																									█									

Устройство противофильтрационного экрана основания производится в процессе отсыпки 1 яруса отвала (по мере готовности захваток), рекультивация поверхности отвала производится в процессе его отсыпки (по мере готовности захваток).
Поэтому сроки проведения данных работ растянуты во времени.

* Календарный график производства работ составлен без привязки к конкретному месяцу и году. Начало производства работ будет фактически определено после окончания конкурса на проведение СМР.
** Биологический этап рекультивации необходимо производить в теплый период года. После определения фактической даты начала работ, необходимо уточнить период выполнения данных работ.


972-ПОС					
Отвал сухого складирования золошлаков					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Гузий П.				07.22
Проверил	Лебеденко				07.22
Проект организации строительства				Стадия	Лист
				П	1
				Листов	3
Н. контр.	Яковлева				07.22
ГИП	Лебеденко				07.22
Календарный график производства работ				ООО "Институт Красноярскгидропроект"	

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

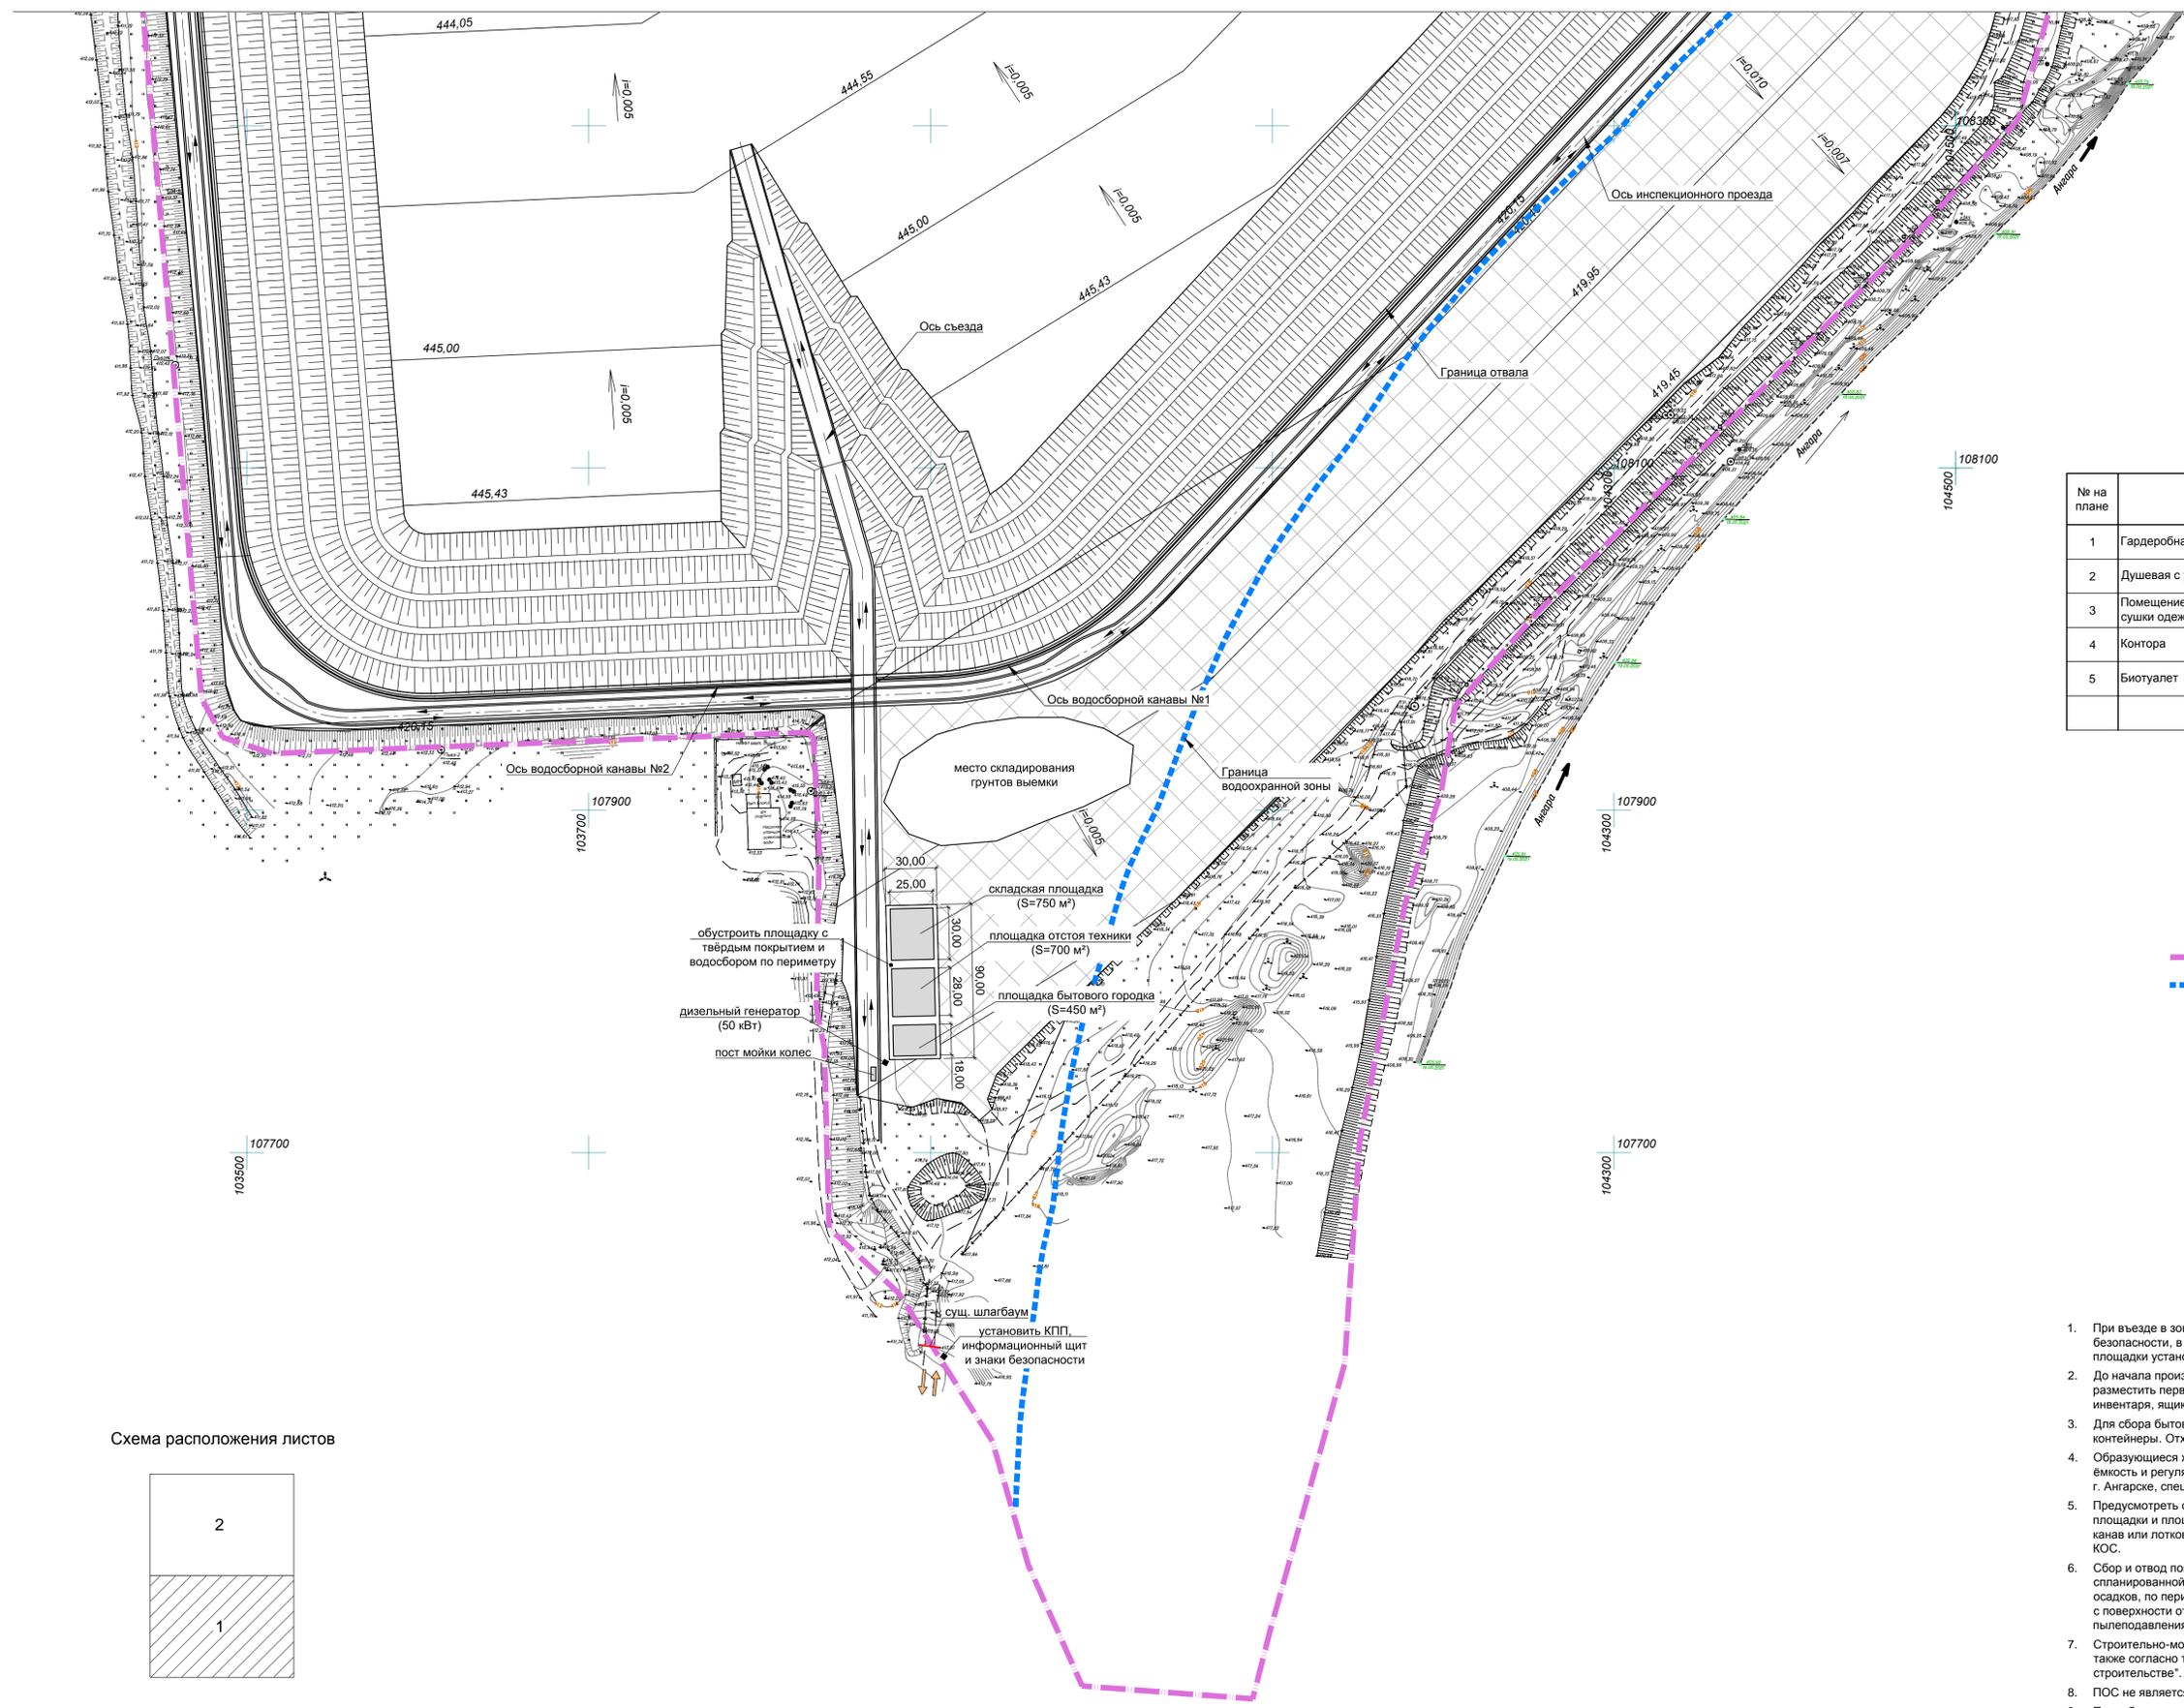

Обустройство площадки бытового городка



Экспликация временных зданий и сооружений


№ на плане	Наименование	Кол-во шт.	Марка, тип	Площадь, м²	Примечание
1	Гардеробная	2	5055-1	21	контейнерное
2	Душевая с умывальной	1	ДК-6	28	контейнерное
3	Помещение для обогрева, отдыха, приема пищи и сушки одежды	1	312-00	20	контейнерное
4	Контора	3	31315	18	контейнерное
5	Биотуалет	2		1,3	моб. туалетная кабина

Условные обозначения

- Граница земельного участка
- Водоохранная зона р. Ангары
- Въезд / выезд на строительную площадку
- Направление движения строительной техники
- Временные бытовые здания контейнерного типа
- Первичные средства пожаротушения

- При въезде в зону производства работ установить КПП, а также информационные щиты и знаки безопасности, в т.ч. знак, запрещающий проход посторонних лиц. При выезде со строительной площадки установить пост мойки колес.
- До начала производства основных строительных-монтажных работ на строительной площадке разместить первичные средства пожаротушения, такие как щиты с набором противопожарного инвентаря, ящики с песком, огнетушители и др.
- Для сбора бытового и строительного мусора на площадке бытового городка установить специальные контейнеры. Отходы регулярно вывозить с территории строительной площадки на полигон отходов.
- Образующиеся хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды собираются в специальную ёмкость и регулярно вывозятся на канализационные очистные сооружения (КОС), расположенные в г. Ангарске, специализированной организацией.
- Предусмотреть сбор поверхностного стока с площадок бытового городка и отстоя техники, складской площадки и площадки установки мусорных контейнеров путем устройства по периметру водосборных канав или лотков с уклоном не менее 0,002 в сторону ёмкости с последующей откачкой и вывозом на КОС.
- Сбор и отвод поверхностного стока с территории строительной площадки производится за счёт спланированной территории золошлакоотвала с уклоном от реки для организации стока атмосферных осадков, по периметру будущего отвала устраиваются водосборные каналы для сбора и отвода осадков с поверхности отвала в запроектированный пруд-отстойник, с последующим использованием воды для пылеподавления во время отсыпки золошлаков в пылеопасные периоды года.
- Строительно-монтажные работы должны производиться в соответствии с рабочей документацией, а также согласно требованиям СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве".
- ПОС не является рабочей документацией. Все строительно-монтажные работы выполнять по ППР.
- Подробное описание технологии и организации строительства см. текстовую часть.



Схема расположения листов



Согласовано	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	


972-ПОС					
Отвал сухого складирования золошлаков					
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	гузий П.				07.22
Проверил	Лебеденко				07.22
Проект организации строительства			Стадия	Лист	Листов
			П	2	
Н. контр.			Строительный генеральный план (начало)		
Яковлева			ООО "Институт Красноярскгидропроект"		
Лебеденко			Формат А1		

Схема расположения листов

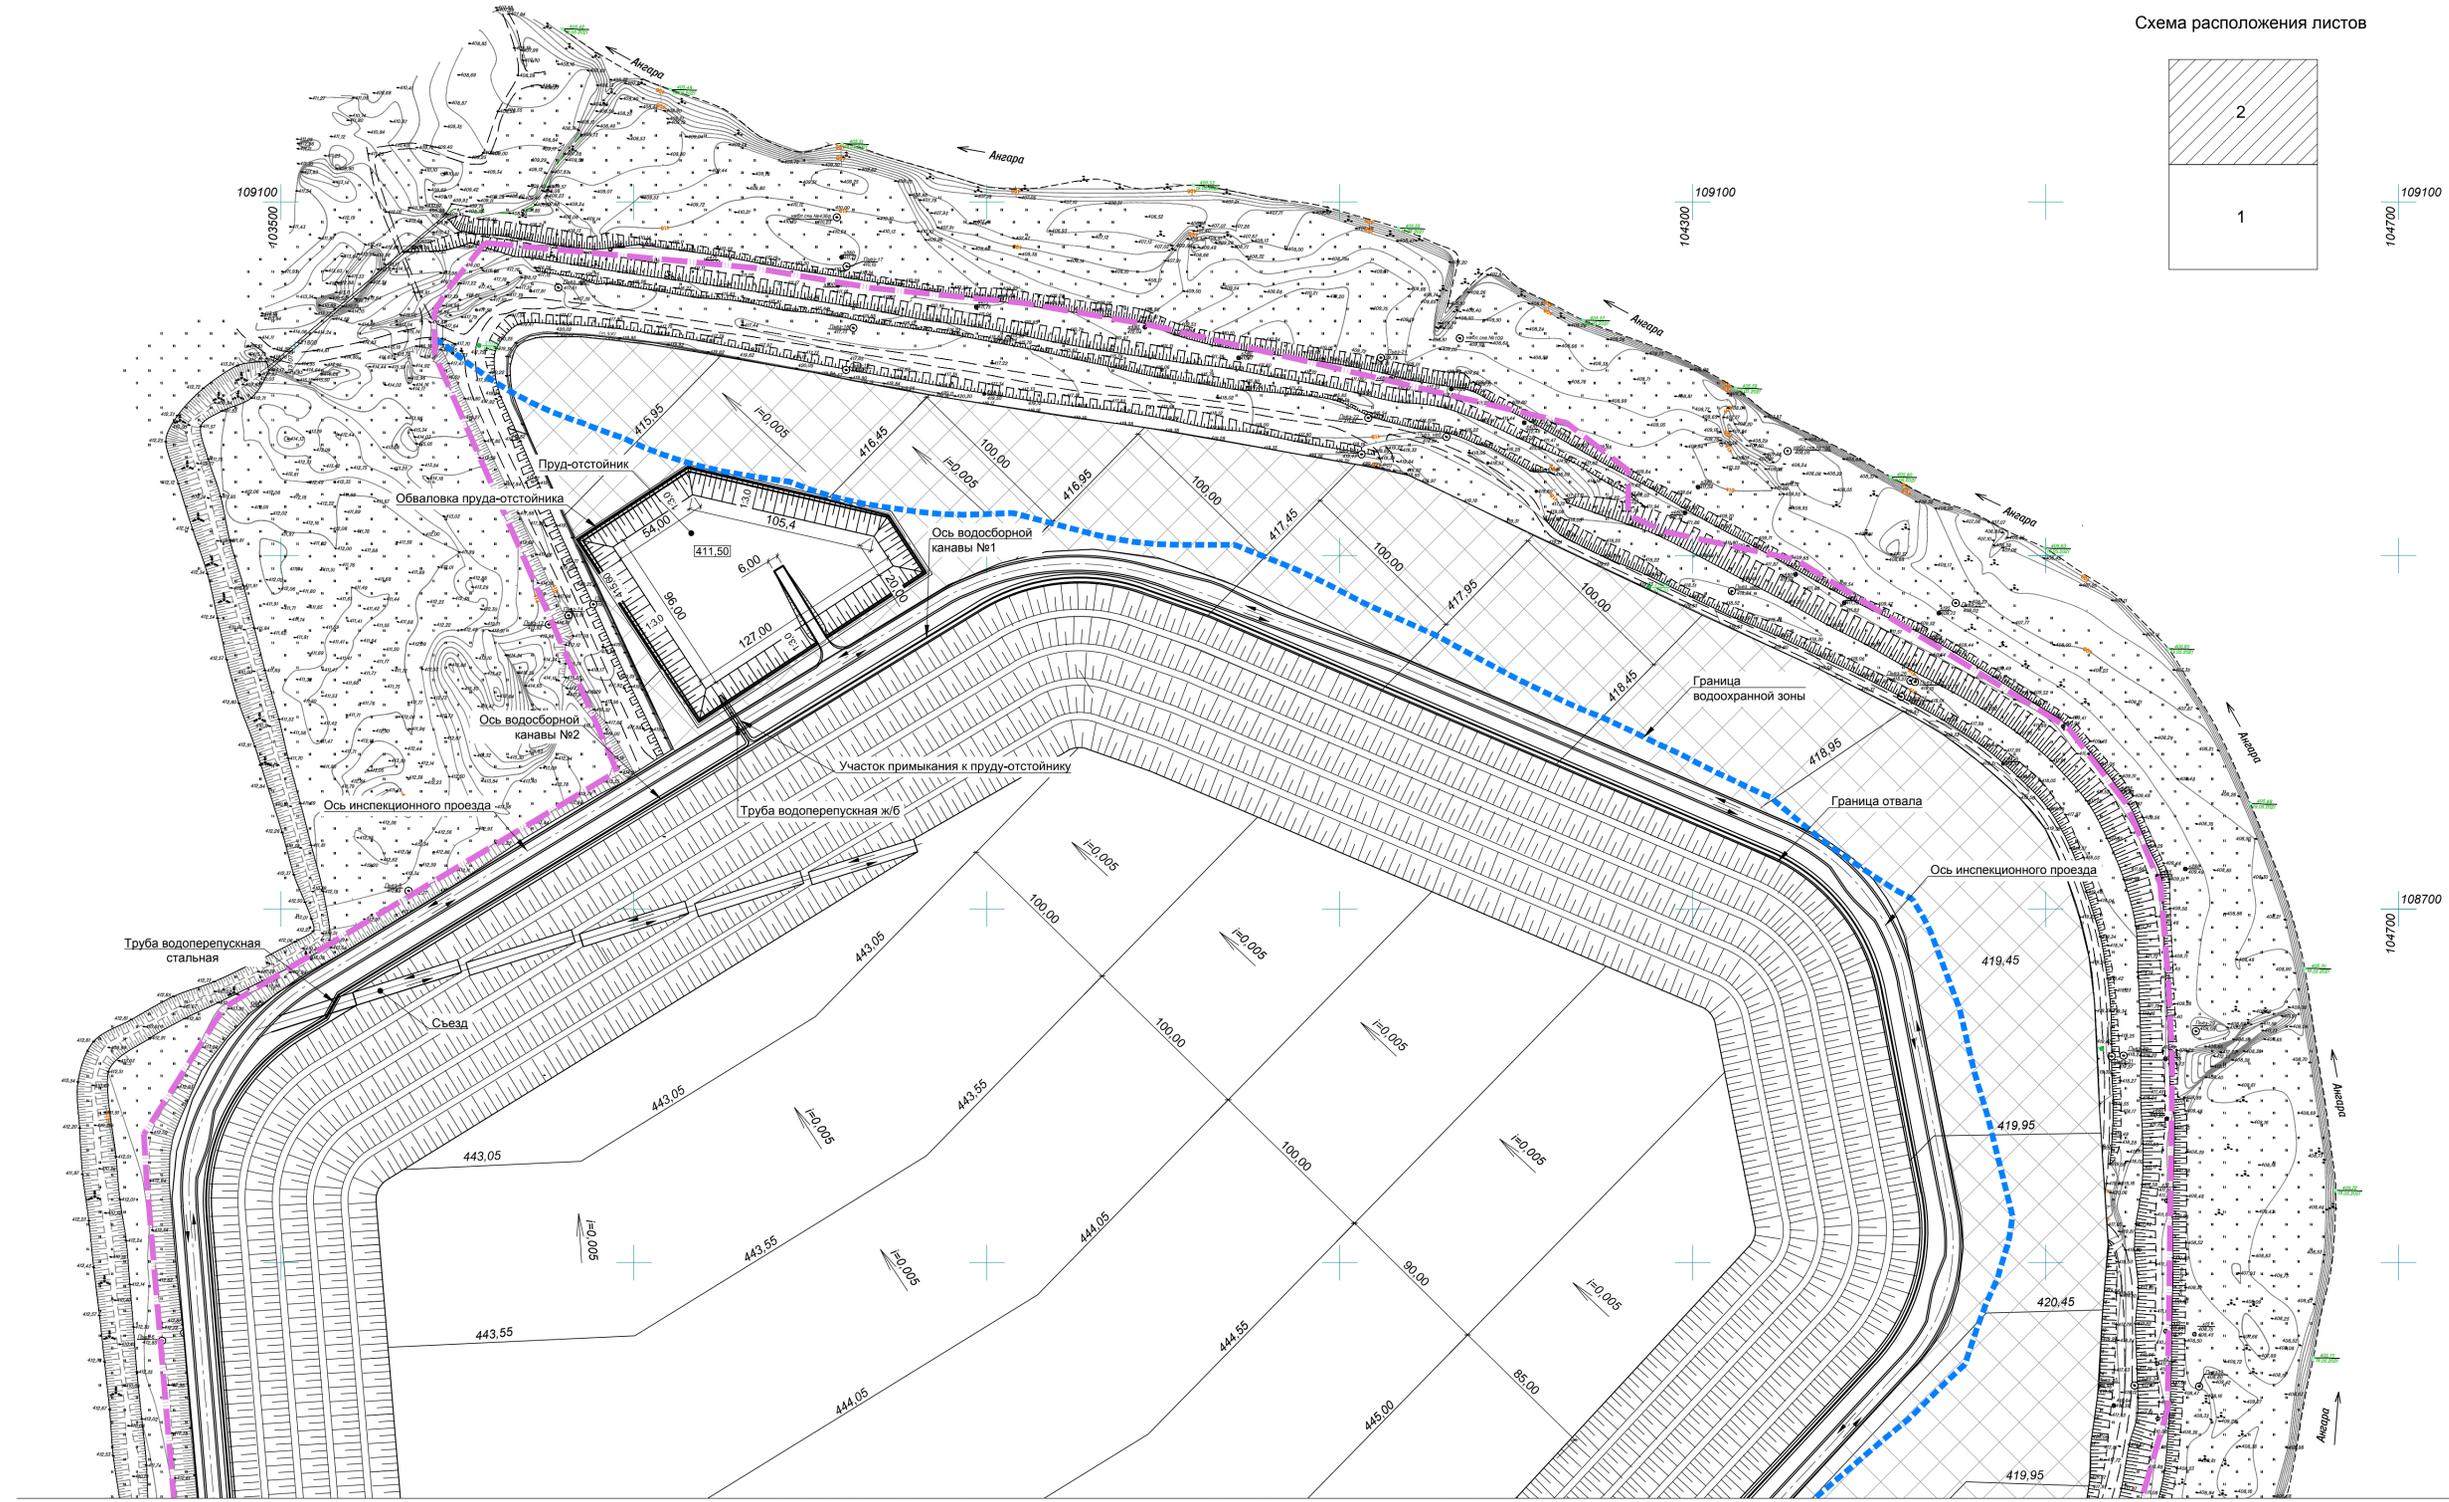


Линия сводки с листом 1

Опасная зона работы крана при монтаже ж/б водоперепускной трубы

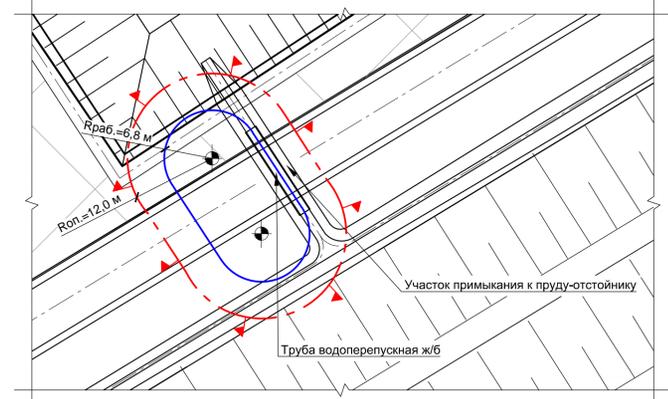

Опасная зона работы крана при монтаже стальной водоперепускной трубы

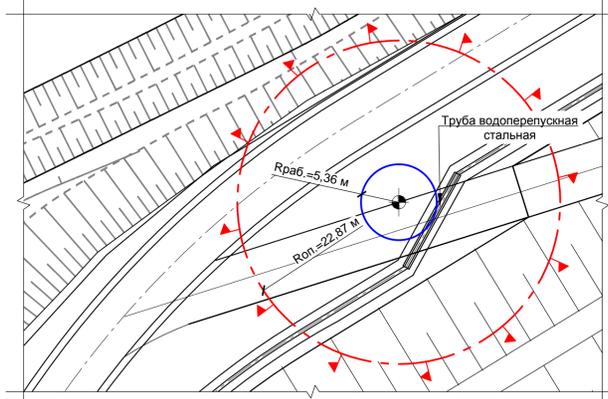

- Условные обозначения
- Граница земельного участка
 - - - Водоохранная зона р. Ангара
 - Направление движения строительной техники
 - Стоянка крана
 - Наибольший рабочий вылет крюка крана
 - - - Граница опасной зоны работы крана

Нахождение людей в опасной зоне во время монтажа строго запрещается! По периметру данной зоны выставить сигнальное ограждение.

1. Примечания см. лист 2.

Согласовано
 Взам. инв. №
 Подп. и дата
 Инв. № подл.

972-ПОС					
Отвал сухого складирования золошлаков					
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Гузий П.				07.22
Проверил	Лебеденко				07.22
Н. контр.	Яковлева				07.22
ГИП	Лебеденко				07.22
Проект организации строительства			Стадия	Лист	Листов
			П	3	
Строительный генеральный план (окончание)			ООО "Институт Красноярскгидропроект"		
Формат А1					

